

مجمع پتروشیمی اسلام آباد غرب

طرح تبدیل گاز طبیعی به پتئ پروپیلن



گزارش ماهانه

آذر ۱۳۹۳



گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه (۴۲)

طرح تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن

مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب

منتهی به آذر ماه ۱۴۰۳



00	12/11/2024	IFI	M.Foromand	S. Jafari	H. Bahrani	
Rev	Date	Status	Prepared By	Checked By	Approved By	Owner Approval

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۲ از ۷۰		

۴- کلیات و اطلاعات کلان طرح

- ۱-۱- مقدمه طرح ۵
- ۲-۱- معرفی طرح ۵
- ۳-۱- وضعیت سهامداران طرح ۶
- ۴-۱- مشخصات کلی طرح ۶
- ۵-۱- تفکیک واحدهای طرح ۷
- ۶-۱- جریان فرآیند طرح ۸
- ۷-۱- یوتیلیتی طرح ۸
- ۸-۱- نقشه جانمایی طرح ۱۰
- ۹-۱- مجوزها، مصوبات و اسناد بالادستی ۱۱

۲- مشخصات قراردادهای طرح

- ۱-۲- لیست وقایع و تاریخ های مهم ۱۴
- ۲-۲- جدول قراردادهای منعقد شده طرح ۱۶
- ۳-۲- وضعیت کلی قرارداد های باقیمانده ۱۹
- ۴-۲- وضعیت پیشرفت بخش های قرارداد نشده طرح به تفکیک چهار دوره پیش از انعقاد قرارداد اصلی اجرایی ۲۰

۳- آخرین وضعیت پیشرفت کل طرح

- ۱-۳- پیشرفت زمانی طرح ۲۲
- ۱-۱-۳- پیشرفت فیزیکی طرح ۲۲
- ۲-۱-۳- پیشرفت فیزیکی طرح به تفکیک EPC ۲۲
- ۳-۱-۳- پیشرفت فیزیکی طرح به تفکیک واحدهای فرایندی و یوتیلیتی ۲۳
- ۴-۱-۳- نمودار پیشرفت طرح ۲۴
- ۲-۳- مشکلات و موانع و چالش های طرح ۲۵
- ۳-۳- مدیریت ریسک ۲۷
- ۴-۳- پیشرفت مالی کل طرح ۲۸
- ۵-۳- بازدیدهای انجام شده از سایت و کارخانه های سازندگان ۲۹
- ۶-۳- جلسات برگزار شده ۲۹

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131	گزارش پیشرفت ماهانه پروژه	منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳
		صفحه: ۳ از ۷۰

۳۳	۷-۳- پروژه GTP
۳۳	۱-۷-۳- پیشرفت زمانی پروژه
۳۳	۲-۷-۳- پیشرفت کل پروژه GTP به تفکیک EPC
۳۳	۳-۷-۳- نمودار پیشرفت پروژه GTP
۳۴	۴-۷-۳- پیشرفت پروژه بر اساس سطح یک WBS طرح های پتروشیمی
۳۵	۵-۷-۳- اهم اقدامات انجام شده تاکنون در پروژه GTP توسط مشارکت بینا و استیم
۳۶	۶-۷-۳- مهندسی پروژه GTP
۴۰	۷-۷-۳- تدارکات پروژه GTP
۴۲	۸-۷-۳- ساختمان، نصب، راه اندازی پروژه GTP
۴۶	۹-۷-۳- مدیریت ارزش کسب شده

۵۰	پروژه مطالعات پایه UTY
۵۱	۸-۳- پروژه مطالعات پایه UTY
۵۱	۱-۸-۳- پیشرفت زمانی پروژه
۵۱	۲-۸-۳- پیشرفت کل پروژه مطالعات پایه UTY:
۵۱	۳-۸-۳- نمودار پیشرفت پروژه فیزیکی و برنامه ای مطالعات پایه UTY:
۵۲	۴-۸-۳- اهم اقدامات انجام شده تاکنون در پروژه مطالعات پایه UTY :
۵۲	۵-۸-۳- جدول پیشرفت بخش مهندسی UTY به تفکیک دیسپلین ها :

۵۴	۴- وضعیت نیروی انسانی / ماشین آلات و HSE کل طرح
۵۵	۱-۴- نیروی انسانی
۵۶	۲-۴- ماشین آلات
۵۷	۳-۴- وضعیت ایمنی طرح

۵۸	۵- صورت وضعیت های پیمانکاران طرح
۵۹	۱-۵- جدول صورت وضعیت های پروژه GTP (پیمانکار بینا و استیم)
۶۱	۲-۵- جدول پیش پرداخت های پروژه GTP (پیمانکار بینا و استیم)
۶۳	۳-۵- جدول صورت وضعیت های هیربدان

۶۴	گزارش تصویری طرح
----	------------------

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۴ از ۷۰

گزارش پیشرفت ماهانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

بخش اول:

کلیات طرح

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهانه پروژه	شماره پروژه: GTTP 1-1/24131
صفحه: ۵ از ۷۰		

۱-۱- مقدمه طرح

شرکت ملی صنایع پتروشیمی طرح احداث مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب در منطقه ویژه اقتصادی زاگرس، در زمینی به مساحت تقریبی ۵۴ هکتار و با استفاده از فن آوری تبدیل گاز طبیعی به متانول، متانول به پروپیلن PVM، و پروپیلن به پلی پروپیلن را در دست اجرا دارد.

با اجرای طرح دانش بنیان تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی و با تکمیل زنجیره ارزش، تولید محصول ارزشمند و کیفی پلی پروپیلن محقق خواهد گردید و بدین ترتیب امکان اجرای ۲۴ طرح مشابه در سراسر کشور با استفاده از این تکنولوژی بومی سازی شده، فراهم خواهد شد. در همین راستا شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، صاحب لیسانس واحدهای مذکور بوده و بسته فرآیندی واحدهای متانول، PVM و PP، همچنین بسته مهندسی پایه واحدهای متانول و متانول به پروپیلن را تهیه نموده است.

کاربرد محصول PP در صنایع مختلفی از جمله موارد ذیل می باشد :

- در صنعت خودرو در ساخت پنل دربها، تزئینات داخلی اتومبیل و سایر قطعات پلیمری
- در صنعت ساختمانی در ساخت لوله و کاربردهای صنعتی
- تولید تک رشته‌ها و الیافها
- کاربرد در قالب گیری دمشی و تزریقی
- تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
- تولید فیلم و ورق
- تولید فیلم‌های بسته‌بندی مواد غذایی و تولید اسباب بازی، موکت، طناب، گونی و...

۲-۱- معرفی طرح

در طرح تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن، گاز طبیعی با انشعاب خط لوله ۱۲ اینچ به عنوان خوراک واحد متانول (از انشعاب ۳۰ اینچ که از خط لوله ۵۶ اینچ (IGAT 6) گاز سراسری) از طریق خط لوله وارد مجتمع شده و پس از کاهش فشار در بخش آفسایت در B.L ناحیه فرآیندی واحد متانول، وارد واحد متانول می‌گردد. همچنین کلیه یوتیلیتی های مورد نیاز واحدهای فرآیندی در B.L واحدهای مذکور فراهم خواهد شد. هرگونه دریافت و یا برگشت سیالات موردنیاز بر اساس مدارک فرآیندی موجود در بسته لیسانس و مهندسی پایه در B.L صورت خواهد گرفت. چیدمان هریک از واحدها در پلات پلن نمایش داده شده است.

ظرفیت تولید واحد متانول ۶۶۰ هزارتن در سال و واحد PVM، ۱۲۰ هزار تن در سال و گرید متانول تولیدی، AA با خلوص بیش از ۹۹.۸۵ درصد می باشد. همچنین پروپیلن تولید شده با فناوری PVM، از نوع گرید پلیمری با بیش از ۹۹.۶ درصد خلوص می‌باشد. ظرفیت تولید واحد PP، ۱۲۰ هزار تن در سال می باشد.

فناوری تولید متانول از گاز طبیعی، شامل دو بخش اصلی سنتر گاز با واحد Reforming و تولید متانول با استفاده از راکتور و سپس بخش تقطیر می‌باشد. فناوری تولید PVM، نیز شامل دو مرحله واکنش اصلی شامل مرحله تولید DME و مرحله تولید پروپیلن در راکتور و واحدهای جداسازی، فشرده سازی، خشک کردن، تصفیه و سرد نمودن می‌باشد. بخش مخازن و ایستگاه بارگیری نیز برای محصول مازاد متانول و محصولات جانبی LPG و بنزین در نظر گرفته شده است. کلیه یوتیلیتی مورد نیاز واحدهای فرآیندی در داخل مجتمع تولید می‌شود. همچنین ناحیه تصفیه آب نیز در داخل مجتمع در نظر گرفته شده است. برق و بخار، هوای ابزار دقیق، هوای پلنت و... مورد نیاز با احداث نیروگاه تامین می گردد.

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۶ از ۷۰		

۳-۱- وضعیت سهامداران طرح

ردیف	نام سهامدار	درصد سهامداری	تعهد مالی سهامداران		آورده نقدی سهامداران		آورده غیر نقدی سهامداران	
			ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی
۱	شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۱۰۰						

۴-۱- مشخصات کلی طرح

عنوان طرح	مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب
نوع فعالیت	طرح تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن
محل اجرای طرح	استان کرمانشاه- منطقه ویژه اقتصادی زاگرس-اسلام آباد غرب
مساحت تقریبی زمین	۵۴ هکتار
میزان خوراک و سوخت تخصیصی	گاز طبیعی به میزان ۳،۱۷۶،۰۱۶ نرمال مترمکعب در روز آب موردنیاز ۷.۵ میلیون متر مکعب سالیانه برق ورودی از شبکه سراسری ۳ مگاوات برق مصرفی ۵۰ مگاوات (تولید در نیروگاه مجتمع)
محصولات اصلی	متانول ۶۶۰، پروپیلن ۱۲۰ و پلی پروپیلن ۱۲۰ هزارتن در سال
محصولات جانبی	بنزین ۵۰ هزارتن در سال و LPG ۱۰ هزارتن در سال
محصولات قابل فروش	متانول ۲۳۵ هزارتن در سال و پلی پروپیلن ۱۲۰ هزارتن در سال بنزین ۵۰ هزارتن در سال و LPG ۱۰ هزارتن در سال
کارفرما	شرکت ملی صنایع پتروشیمی
صاحب لیسانس و دانش فنی	شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
مدیر طرح	شرکت مهندسان مشاور شارگان
پیمانکار مهندسی مطالعات پایه واحدهای فرایندی	شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
پیمانکار مهندسی پایه واحدهای یوتیلیتی و آفسایت	شرکت مدیریت هیربدان
پیمانکار آماده سازی سایت	شرکت باروبن
پیمانکار EPCC احداث واحدهای GTP شامل متانول، پروپیلن، مخازن متانول و PVM، خط گاز و فلر	مشارکت شرکت بینا و استیم (EPCC)
پیمانکار EPCC واحدهای یوتیلیتی و آفسایت	-
پیمانکار EPCC واحد PP	-
پیمانکار بازرسی شخص ثالث	مشارکت آی اس تهران و مهندسی و بازرسی فنی ایکا
پیمانکار مطالعات مکانیک خاک کل طرح	شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کرمانشاه

۵-۱- تفکیک واحدهای طرح

واحدهای مجتمع به تفکیک فرآیندی و یوتیلیتی بدین شرح می باشد:

تفکیک واحدهای فرآیندی و یوتیلیتی طرح

واحدهای فرآیندی

واحد تولید متانول از گاز طبیعی

واحد تولید پروپیلن

واحد تولید پلی پروپیلن

واحدهای یوتیلیتی، آفسایت و آف پلات

واحد تصفیه آب

واحد تولید بخار

واحد خنک کننده آب

واحد تولید برق

واحد سوخت

واحد تقلیل فشار گاز (ایستگاه گاز)

واحد آب آتشنشانی

واحد مخازن ذخیره و بارگیری

اینترکانکشن

واحد فلر

خط انتقال گاز

واحد تولید هوای ابزار دقیق و پلنت

خط انتقال آب

واحد تولید نیتروژن

ساختمان‌های غیر صنعتی


واحد تولید آب

واحد تامین اتیلن مورد نیاز PP

۶-۱- جریان فرآیند طرح

جریان فرآیند (Process) از ابتدا تا انتهای طرح مطابق نمودار زیر می باشد:

۳,۱۷۶,۰۱۶ نرمال مترمکعب در روز

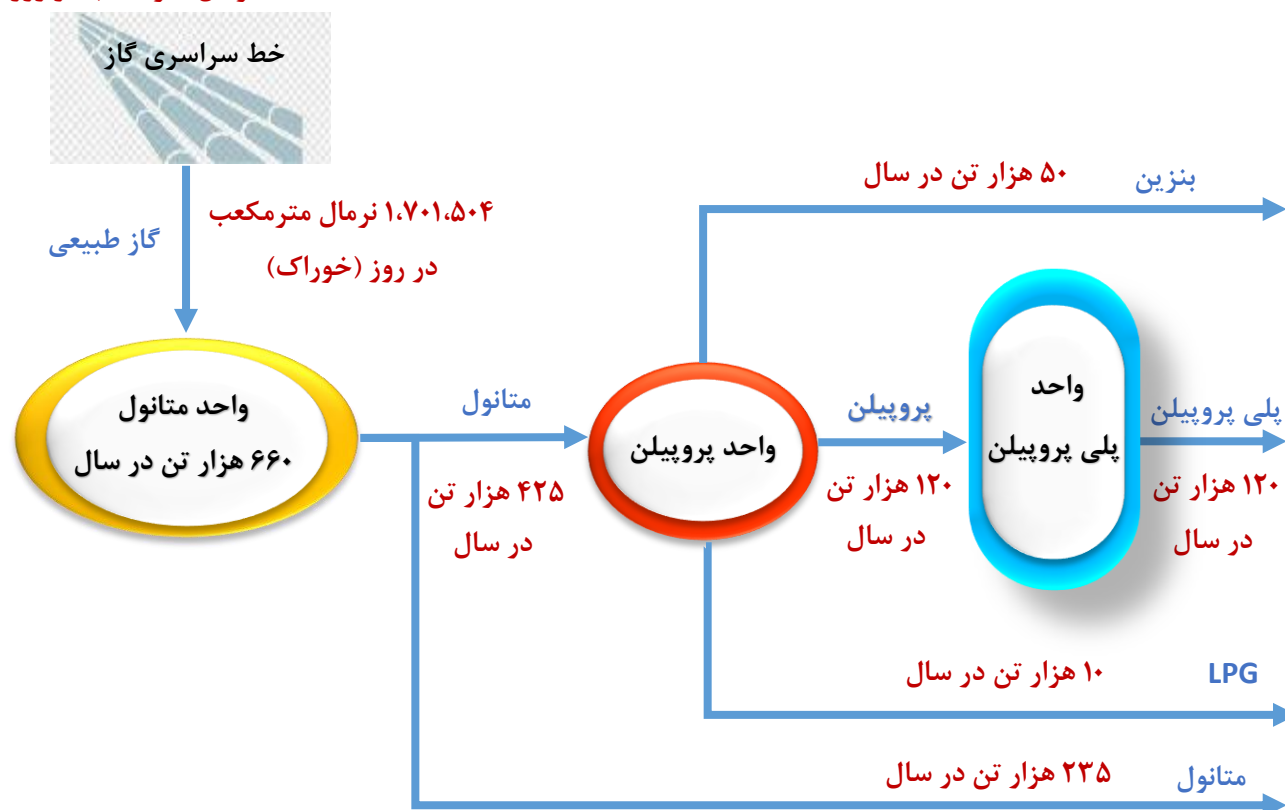

۷-۱- یوتیلیتی طرح


بر اساس برآوردهای انجام شده میزان آب، برق و گاز موردنیاز طرح در دوره بهره‌برداری به شرح جدول زیر می باشد:


نوع	آب	برق	گاز
میزان	780 m ³ /hr	50.00 MW**	152,426 nm ³ /hr *
محل تأمین	تصفیه خانه اسلام آباد غرب	نیروگاه داخل سایت	از خط گاز سراسری
آخرین وضعیت تأمین	- در مرحله مذاکره جهت عقد قرارداد با اداره آب و فاضلاب	- طراحی مفهومی توسط مشارکت بینا و استیم و طراحی پایه توسط مشاور مدیریت هیربدان انجام گردیده	- در مرحله انعقاد قرارداد و اخذ نوبت جهت انشعاب گیری از خط سراسری

* بر اساس آخرین محاسبات انجام شده میزان گاز موردنیاز حدود 81,530 nm³/hr سوخت و 70,896 nm³/hr خوراک می‌باشد. همچنین میزان 47,574 nm³/hr نیز جهت طرح توسعه پیش بینی گردیده است.

** بر اساس آخرین گزارشات، علاوه بر موارد فوق میزان 3.5MW نیز از شبکه سراسری برق دریافت خواهد شد.

دیگر نیازمندی های واحدهای فرآیندی از واحد یوتیلیتی طرح تامین می گردد و نحوه تبادل واحدهای فرآیندی با یوتیلیتی مطابق نمودار زیر تعریف شده است:

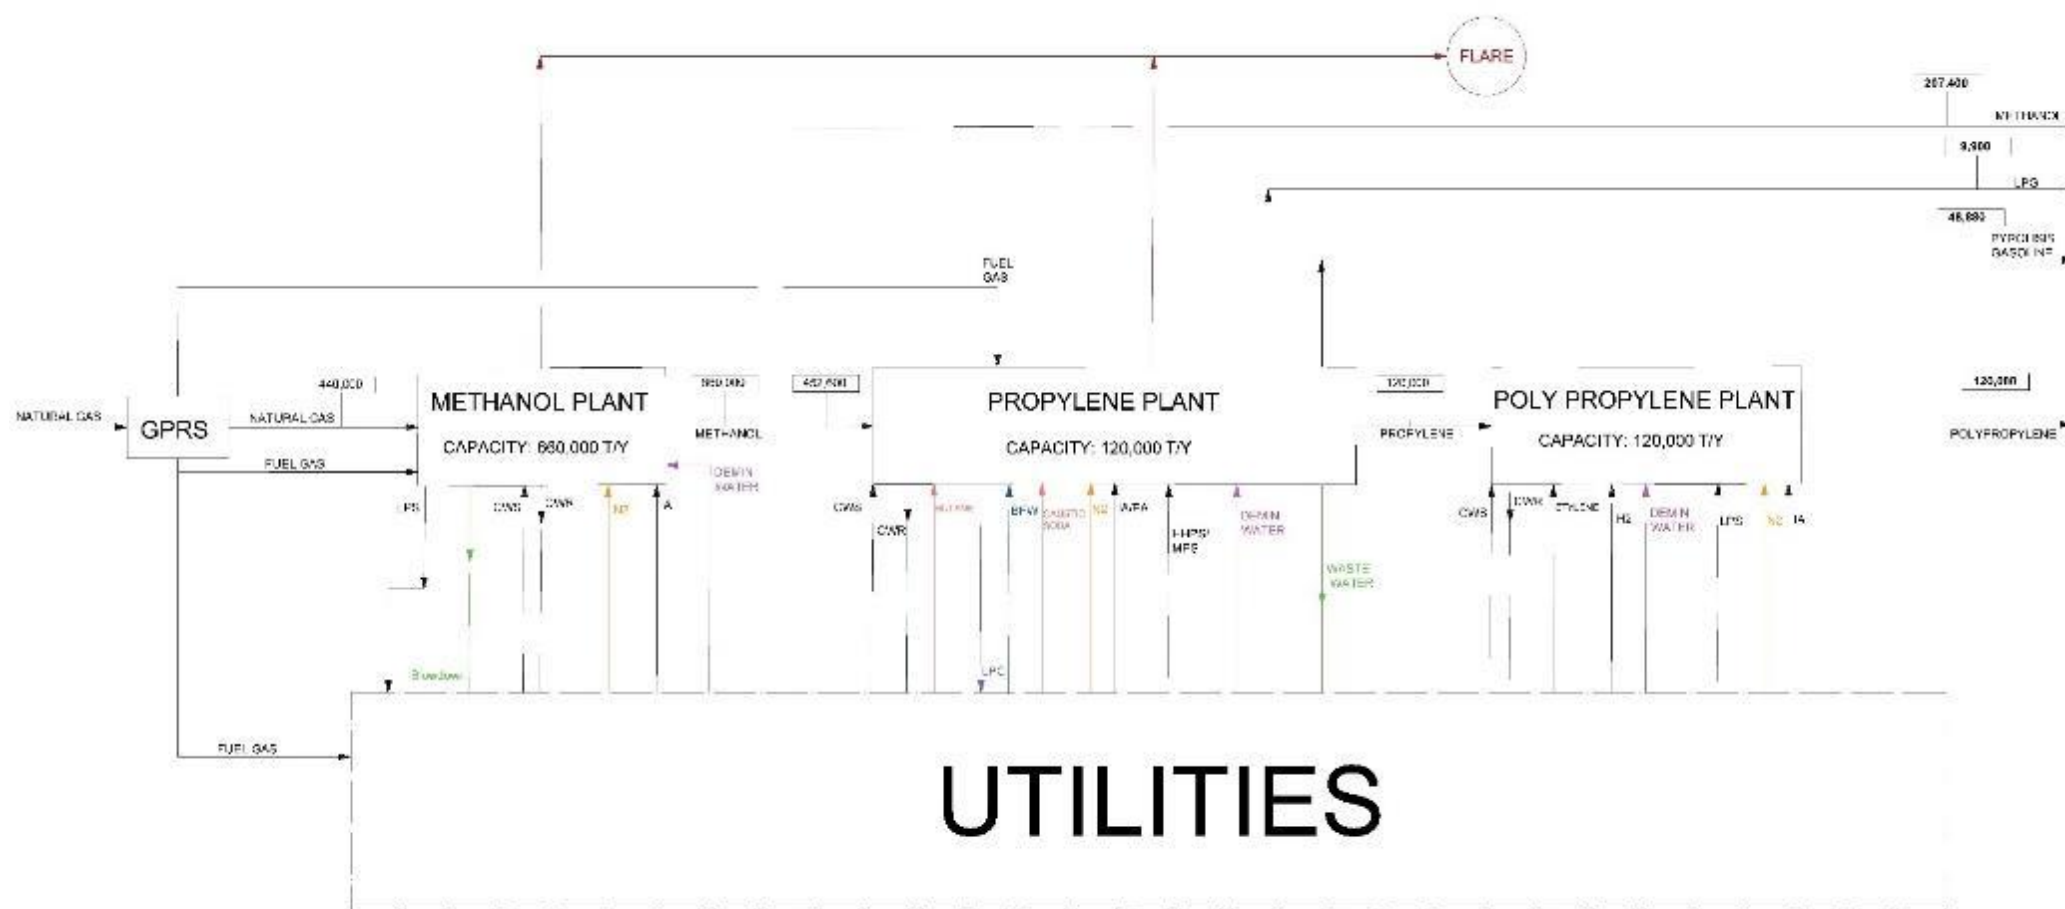

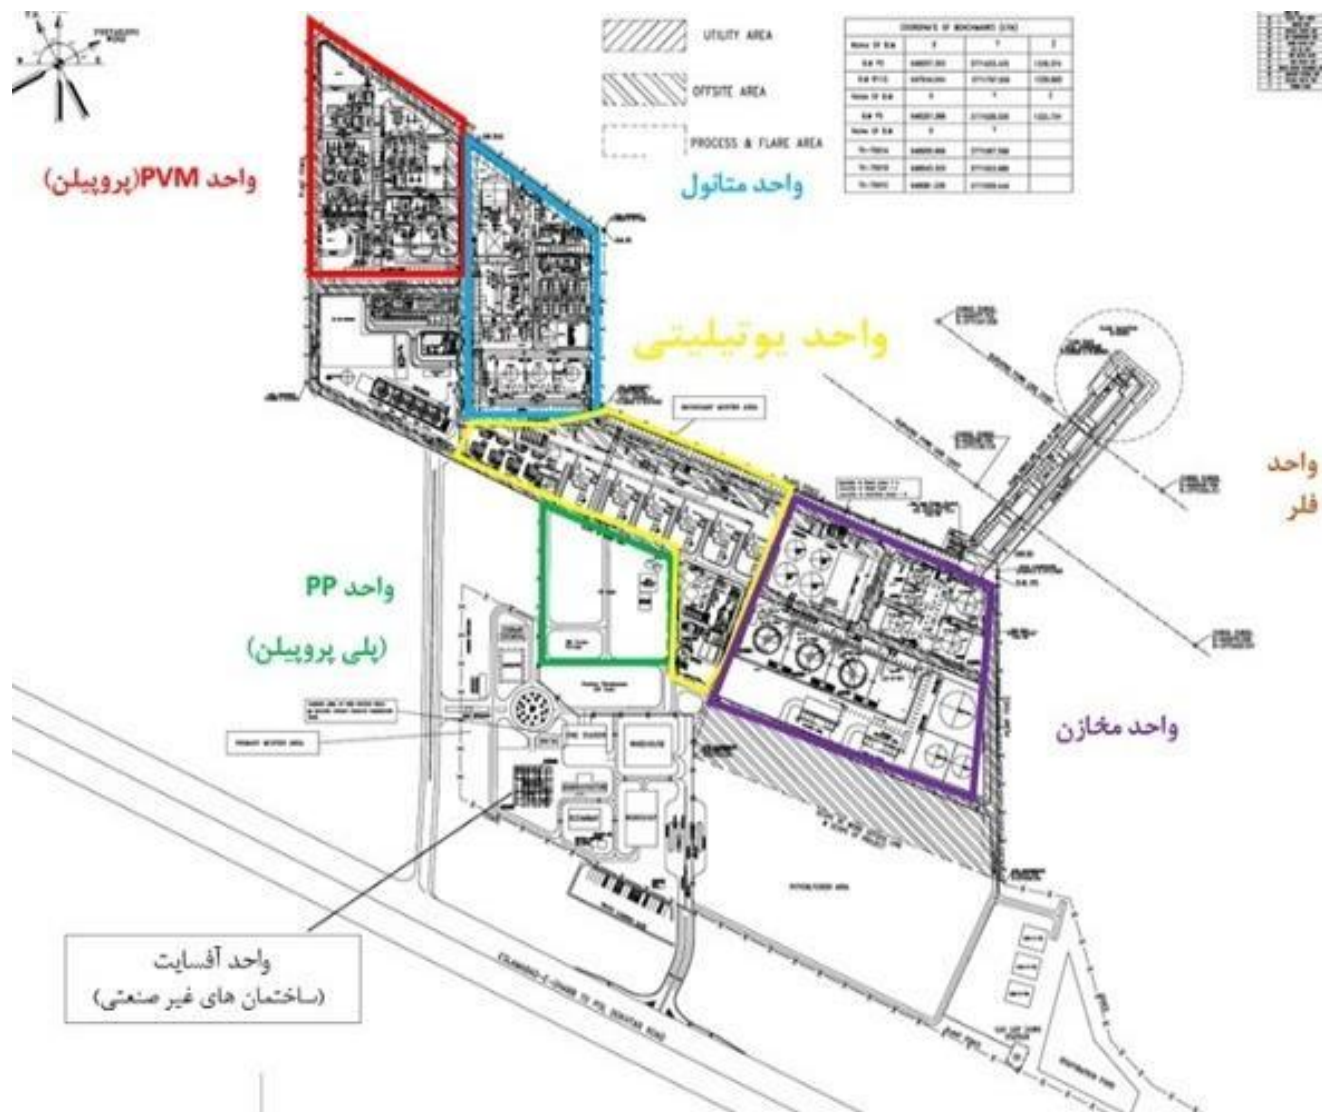

۱-۸- نقشه جانمایی طرح

آخرین ویرایش نقشه جانمایی طرح (Overall Plot Plan) در شکل مقابل قابل مشاهده است که در آن واحدهای متانول، پروپیلن (PVM) و پلی پروپیلن (PP) و همچنین واحدهای یوتیلیتی و مخازن و خط فلر مشخص گردیده است.

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۱۱ از ۷۰		

۹-۱- مجوزها، مصوبات و اسناد بالادستی

آخرین وضعیت مجوزها، مصوبات و اسناد بالادستی طرح بدین شرح می باشد:

ردیف	محدوده	مجوز / مصوبه / سند بالادستی	سازمان مربوطه	توضیح	تاریخ اخذ مجوز	تاریخ اعتبار مجوز
۱	اجرای طرح	مجوز طرح در اسلام آباد غرب	معاونت برنامه ریزی وزارت نفت	صورتحجلسه شماره م ب ۳۴۹۷۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	
۲		موافقت اصولی در خصوص اقدام به احداث طرح پروپیلن از متانول	معاونت برنامه ریزی وزارت نفت	نامه شماره ۳۵۹۰۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	
۳		مصوبه اجرای طرح GTPP در اسلام آباد غرب	هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی	مصوبه شماره ۱۱۱۱/۱۶۶۳/۱۳۸ - ۱ ص پ	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	
۴		موافقت اصولی اولیه اجرای طرح تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی	معاونت برنامه ریزی وزارت نفت	شماره ۱۱۹۱۴۰ م ب	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	
۵		مجوز اقتصادی طرح برای اجرای زنجیره کامل طرح دانش بنیان GTPP در اسلام آباد غرب	شورای اقتصاد	شماره ۳۴۹۳۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	
۶		تمدید موافقت اصولی - نوبت اول	معاونت برنامه ریزی وزارت نفت	شماره ۵۳۴۱۸۱ م ب	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۷	سرمایه گذاری	فراخوان جهت سرمایه گذاری در طرح	واحد سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی	اعلام نتیجه فراخوان طی نامه شماره ۱-۸/۷۷۰۶۱ ص پ	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	
۸		سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	مجوز شورای اقتصاد به شماره ۵۲۰۰۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	
۹		تصویب نامه جهت سرمایه گذاری در طرح تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی در اسلام آباد	هیات وزیران	شماره ۵۷۷۴۷/۱۳۳۶۷۴ ت	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	
۱۰		برگزاری مجدد فراخوان عمومی برای سرمایه گذاری در طرح	واحد سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی	اعلام نتیجه طی نامه شماره ۷۸۸۸۴ / ۸ - ۱ ص پ	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	
۱۱	زمین	مصوبه تشکیل کارگروه خرید زمین طرح	هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی	مصوبه شماره ۱۱۱۱/۱۶۶۷/۱۴۵ - ۱ ص پ	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	
۱۲		مصوبه خرید زمین طرح به قیمت کارشناسی	هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی	مصوبه شماره ۱۱۱۱/۱۶۷۴/۱۶۵ - ۱ ص پ	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۱۲ از ۷۰		

ردیف	محدوده	مجوز / مصوبه / سند بالادستی	سازمان مربوطه	توضیح	تاریخ اخذ مجوز	تاریخ اعتبار مجوز
۱۳	تاسیس شرکت	مصوبه تاسیس شرکت صنایع پتروشیمی اسلام آباد غرب	هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی	مصوبه شماره ۱-۱۱۱/۱۶۷۱/۱۵۹ ص پ- و ثبت به شماره ۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۷۹۹۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	
۱۴	محیط زیست	مجوز اولیه محیط زیست	سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه	نامه شماره ۹۹/۵۴۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	
۱۵		مجوز نهایی محیط زیست	سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه	نامه شماره ۱۴۰۰/۵۲۸۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۶	مهندسی	انجام مهندسی پایه طرح دانش بنیان توسط شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی	هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی	مصوبه شماره ۱-۱۱۱/۱۶۶۷/۱۳۱ ص پ	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	
۱۷	یوتیلیتی	مجوز تخصیص برداشت ۶.۵ میلیون مترمکعب آب در سال از پساب تصفیه خانه اسلام آباد	شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه			
۱۸		اخذ مجوز سوخت و خوراک	مدیریت بهینه سازی انرژی در بخش صنعت	نامه شماره ۱۸۶۸۱۱-۱۳۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	
۱۹		امکان پذیری تامین گاز مورد نیاز طرح	مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران	نامه شماره گ-۲۵۶۵۲/۰۰۰/۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	
۲۰	پدافند	تائیدیه پدافند غیر عامل	سازمان پدافند غیرعامل	نامه شماره ۳۲۱۳/۲/۲۰۱/۹۹۲۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	

بخش دوم:

مشخصات قراردادهای طرح

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۱۴ از ۷۰		

۱-۲- لیست وقایع و تاریخ های مهم

ردیف	بخش / رکن پروژه	مایلستون	تاریخ برنامه ای	تاریخ واقعی
۱	اقدامات اولیه	مطالعات زیست محیطی گزارش نهائی EIA محیط زیست	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۲		خرید زمین و تحصیل اراضی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۳		تحويل زمین طرح	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۴		مطالعات نقشه برداری	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۵		مطالعات ژئوتکنیک اولیه	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۶		برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار آماده سازی زمین	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۷		پایان عملیات آماده سازی زمین	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰
۸		انجام مطالعات اولیه HAZOP, HAZID, SIL, Consequence	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۹	مدیریت طرح	عقد قرارداد و شروع به کار MC	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۱۰		پایان قرارداد MC	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	
۱۱		پایان قرارداد MC با احتساب تمدید مدت پیمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
۱۲	مهندسی پایه واحدهای متانول و PVM	عقد قرارداد و شروع به کار مشاور	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۶
۱۳		پایان قرارداد مشاور	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱۴	قرارداد EPC واحدهای متانول و PVM (GTP)	تهیه اسناد مناقصه EPCC و انتخاب پیمانکار	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱
۱۵		ابلاغ قرارداد پیمانکار GTP	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۶		تشکیل جلسه KOM و شروع قرارداد پیمانکار GTP	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۷		تحويل زمین پیمانکار GTP	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۸		پایان واحد GTP	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	
۱۹		پایان واحد GTP با احتساب تمدید مدت پیمان (الحاقیه شماره ۲)	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	
۲۰		نهایی سازی اسناد مناقصه	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۱۵ از ۷۰		

ردیف	بخش / رکن پروژه	مایلستون	تاریخ برنامه ای	تاریخ واقعی
۲۱	مهندسی پایه یوتیلیتی و آفسایت	عقد قرارداد و شروع به کار مشاور	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۲۲		پایان قرارداد مشاور	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	
۲۳		پایان قرارداد مشاور با احتساب تمدید مدت پیمان (الحاقیه شماره ۱)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۲۴	اجرای EPCC واحد PP	نهایی سازی تهیه اسناد مناقصه EPCC	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	
۲۵		ابلاغ قرارداد پیمانکار PP	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	
۲۶		شروع واحد PP	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
۲۷		پایان واحد PP	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۲۸	اجرای EPCC واحد یوتیلیتی و آفسایت	نهایی سازی اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار EPCC	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	
۲۹		ابلاغ قرارداد پیمانکار یوتیلیتی و آفسایت	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	
۳۰		شروع واحد یوتیلیتی و آفسایت	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	
۳۱		پایان واحد یوتیلیتی و آفسایت	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	
۳۲	مشاور بازرسی	نهایی سازی اسناد مناقصه	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۳۳		عقد قرارداد و شروع به کار بازرسی	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۳۴		پایان قرارداد بازرسی	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	
۳۵		پایان قرارداد بازرسی با احتساب تمدید مدت پیمان	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	
۳۶	مشاور ژئوتکنیک (خارج از محدوده GTP)	نهایی سازی شرح خدمات مطالعات لرزه خیزی و مکانیک خاک	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۳۷		شروع به کار ژئوتکنیک	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۸		پایان کار ژئوتکنیک	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	

* این بخش بر اساس الزامات قراردادی و استراتژی های عقد قرارداد و مطابق با طرح و برنامه زمانبندی تفصیلی تایید شده پیمانکاران تکمیل می گردد.

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۱۶ از ۷۰

۲-۲- جدول قراردادهای منعقد شده طرح

مشخصات قراردادهای منعقد شده تاکنون به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	موضوع قرارداد	نام مشاور / پیمانکار	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد (نرخ تسعیر یورو (۲۸۰,۰۰۰ ریال)	مبلغ تجمعی آخرین صورت وضعیت تایید شده	توضیحات
۱	انجام مهندسی پایه واحدهای فرآیندی طرح	پژوهش و فناوری پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۱		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	خدمات مهندسی چیدمان سایت	کندا ایده	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳		۳,۲۳۹,۳۷۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	طبق اطلاعات دریافتی از کارفرما، مبلغ مربوطه بیش از مبلغ قرارداد می باشد.
۳	انجام مطالعات SIL ، HAZOP	دانشگران صنعت پژوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱		۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	طبق اطلاعات دریافتی از کارفرما، مبلغ مربوطه بیش از مبلغ قرارداد می باشد.
۴	تهیه اسناد مناقصه، انجام برآورد و پشتیبانی فنی	برساد سازان کیمیا	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶		۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	آماده سازی سایت	باروبن	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۷.۵	۲۷۲,۵۶۶,۷۸۲,۹۴۵	۴۵۶,۴۹۴,۸۱۰,۸۰۵	مبالغ با احتساب تعدیل می باشد.
۶	خدمات دفتری و نگهداشت تاسیسات	کاوش صنعت عصر کهن	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۱		۵۲,۹۲۰,۵۵۴,۵۳۰	۵۴,۶۲۱,۴۴۱,۵۱۶	
۷	حراست	نوبین صنعت گلزار	-	-		۱۵,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۷,۶۰۷,۱۴۷	

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTTP 1-1/24131

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۱۷ از ۷۰

ردیف	موضوع قرارداد	نام مشاور/ پیمانکار	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد	مبلغ کل قرارداد (نرخ تسعیر یورو (۲۸۰,۰۰۰ ریال)	مبلغ تجمعی آخرین صورت وضعیت تایید شده	توضیحات
۸	-	خرید زمین	-	-	-	۳۷۹,۸۸۱,۹۵۰,۰۰۰	-	۳۷۹,۸۸۱,۹۵۰,۰۰۰	
۹	-	هزینه خرید تجهیزات سایت	-	-	-	۹,۱۷۸,۹۰۸,۴۰۰	-	۹,۱۷۸,۹۰۸,۴۰۰	
۱۰	احداث واحدهای متانول و پروپیلن - PVM مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب به روش EPCC	مشارکت طرح و ساخت بینا و استیم	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸ • تحویل زمین ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ • شروع به کار سایت ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۳۶ + ۲۹	۱۸,۰۷۴,۴۹۵,۶۹۳,۸۲۶ ریال	۸۱,۷۰۸,۵۸۲,۰۱۳,۸۲۶	۶,۹۱۲,۵۸۴,۸۸۰,۳۸۲ ریال	بر اساس مبلغ تایید شده صورت وضعیت شماره ۴۱ منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و صورت وضعیت تعدیل شماره ۲۰ منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
						۲۲۷,۲۶۴,۵۹۴ یورو		۶۴,۸۹۰,۷۴۲ یورو	
۱۱	ارائه خدمات فنی - تخصصی و مدیریت طرح (MC) مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب	مهندسان مشاور شارگان	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۴۲ + ۴	۱,۲۱۰,۵۰۵,۳۴۶,۰۱۵	-	۱,۳۴۵,۱۸۷,۱۹۶,۸۸۱	بر اساس مبلغ تایید شده صورت وضعیت شماره ۴۱ منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ و صورت وضعیت اسکان شماره ۱۰ منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۱۸ از ۷۰

ردیف	موضوع قرارداد	نام مشاور/ پیمانکار	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد	مبلغ کل قرارداد (نرخ تسعیر یورو (۲۸۰,۰۰۰ ریال)	مبلغ تجمعی آخرین صورت وضعیت تایید شده	توضیحات
۱۲	بازرسی خرید و ساخت کالا و ساختمان و نصب مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب	مشارکت تهران آی اس و مهندسی و بازرسی فنی ایکا	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۲ ۱۲ +	۱۲۷,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۶۸۲,۱۳۶,۲۵۱	بر اساس مبلغ تایید شده MC صورت وضعیت شماره ۱۸ منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ و صورت وضعیت تعدیل شماره ۲ منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۳	انجام طراحی مهندسی پایه، برآورد احجام، تخمین قیمت و تهیه اسناد مناقصه EPCC واحدهای یوتیلیتی و آفسایت مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب	شرکت مدیریت هیریدان	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۵ ۱۲ +	۱۴۹,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۲,۴۹۱,۷۰۰,۰۰۰	بر اساس مبلغ تایید شده صورت وضعیت شماره ۳ منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۴	مطالعات مکانیک خاک (ژئوتکنیک) و لرزه خیزی محدوده طرح GTPP مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب	شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۴	۲۶,۰۸۶,۹۵۲,۰۳۷	-	-	

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۱۹ از ۷۰		

۲-۳- وضعیت کلی قرارداد های باقیمانده

ردیف	دسته بندی	شرح ردیف	مطالعات پایه واحد پلی پروپیلن (PP)	اجرای EPCC واحد پلی پروپیلن (PP)	اجرای EPCC واحدهای یوتیلیتی و آفسایت
۱	پیش نیاز	مجوز انجام کار	☒	☒	☒
۲		کاربرگ بودجه / تامین مالی	☒	☒	☒
۳	مهندسی کار	شرح کار	☒	☒	☒
۴		مشخصات فنی و خصوصی	☒	☒	☒
۵		برآورد هزینه اجرای کار	☒	☒	☒
۶	ارزیابی کیفی	تهیه اسناد ارزیابی کیفی	☒	☒	☒
۷		تأیید اسناد ارزیابی کیفی	۸۰٪	☒	☒
۸		انجام ارزیابی کیفی			☒
۹	تمهیدات ارجاع کار	تهیه پیش نویس قرارداد			☒
۱۰		تهیه اسناد پیشنهاد قیمت			☒
۱۱		تأیید اسناد پیشنهاد قیمت			☒
۱۲		تأیید پیش نویس قرارداد			
۱۳		تأیید پیش نویس قرارداد توسط HSE			
۱۴		انجام فرآیند ارجاع کار (ارزیابی فنی-مالی)			
۱۵		انتخاب طرف قرارداد، انعقاد و ابلاغ قرارداد			

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۲۰ از ۷۰		

۲-۴- وضعیت پیشرفت بخش های قرارداد نشده طرح به تفکیک چهار دوره پیش از انعقاد قرارداد اصلی اجرایی

آخرین وضعیت		وضعیت پروژه های PP و یوتیلیتی طرح اسلام آباد غرب	
اجرای EPCC واحدهای یوتیلیتی و آفسایت	اجرای EPCC واحد پلی پروپیلن (PP)		
✓	✓	۱. تهیه FSB و Overall Implementation Schedule	دوره اول
-	-	۲. ثبت شرکت مجری طرح با حداقل سرمایه ثبتی ۰.۱ درصد سرمایه گذاری کل طرح	
✓	✓	۳. دریافت جواز تاسیس و کد اقتصادی	
✓	✓	۴. انعقاد قرارداد/ موافقت نامه زمین طرح	
✓	✓	۵. انتخاب مشاور زیست محیطی و شروع فعالیتهای لازم جهت اخذ مجوز زیست محیطی	
✓	✓	۶. انعقاد قرارداد تامین خوراک و سوخت	
✓	✓	۷. اخذ موافقت نامه تامین آب دوران ساخت و بهره برداری	
✓	✓	۸. اخذ موافقت نامه تامین برق دوران ساخت و بهره برداری	
✓	✓	۹. انتخاب مشاور مطالعات زمین شناسی و نقشه برداری	
✓	✓	۱۰. تهیه چارت سازمانی و مشخص نمودن نفرات کلیدی پروژه	
✓	✓	۱۱. تهیه فهرست صاحبان لیسانس و شروع مذاکره با آنها	
✓	✓	۱۲. ارائه گزارشات ماهانه طرح	
✓	✓	۱. انتخاب دانش فنی و صاحب لیسانس	دوره دوم
✓	✓	۲. انعقاد قرارداد لیسانس و موثر نمودن آن و دریافت بسته PDP	
✓		۳. تهیه فهرست شرکت های پیمانکار اصلی (EPC) و شروع مذاکره با آنها	
✓	✓	۴. مشخص نمودن منبع تامین تسهیلات مالی پروژه	
✓	✓	۵. انعقاد قرارداد تامین آب دوران ساخت و بهره برداری	
✓	✓	۶. انعقاد قرارداد تامین برق دوران ساخت و بهره برداری	
✓	✓	۷. نهایی نمودن گزارشات زیست محیطی (EIA) و مطالعات زمین شناسی (ژئوتکنیک)	
✓	✓	۸. اخذ تاییدیه زیست محیطی از پتروشیمی و ارجاع به کمیسیون ماده ۲ سازمان حفاظت از محیط زیست	
		۹. انتخاب پیمانکار آماده سازی زمین (خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح و تحکیم زمین و حصار کشی)	
		۱۰. ارائه گزارشات ماهانه طرح	
		۱. انتخاب شرکت پیمانکار اصلی (EPC) و عقد قرارداد	دوره سوم
		۲. ارائه برنامه جامع اولیه اجرای طرح (Master Plan) بر اساس قرارداد (EPC)	
		۳. مشخص نمودن بانک عامل جهت اخذ تسهیلات مالی پروژه و تشکیل پرونده	
✓		۴. شروع مهندسی پایه	
		۵. آماده سازی زمین (خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح و تحکیم زمین) و حصار کشی آن	
		۶. اخذ مجوز نهایی زیست محیطی	
✓		۷. تهیه فهرست شرکت های پیمانکار یوتیلیتی و آفسایت و شروع مذاکره با آنها	
		۸. ارائه گزارشات ماهانه طرح	
		۱. شروع فعالیت شرکت پیمانکار اصلی (EPC) بصورت موثر شدن قرارداد و یا در قالب قرارداد Early Work	دوره چهارم
		۲. تکمیل پرونده و قطعی شدن عاملیت بانک	
		۳. گشایش و موثر نمودن اعتبار اسنادی طرح (LC) (در صورت نیاز)	
-	-	۴. افزایش سرمایه شرکت به میزان حداقل ۱۰٪ سرمایه گذاری کل طرح	
		۵. عقد قرارداد واحد یوتیلیتی و آفسایت و موثر نمودن آن	
		۶. ارائه برنامه زمانبندی بروز شده، ساختار شکست کار (WBS) تا سطح ۴ مطابق فرم مدیریت طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی	
		۷. شروع مهندسی تفصیلی	
		۸. سفارش گذاری اقلام دیر تحویل طرح	
		۹. شروع فعالیتهای سیویل و ساختمان طرح	
		۱۰. انجام فعالیت های مهندسی، تدارکات، سیویل و ساختمان مطابق برنامه زمانبندی طرح	
		۱۱. ارائه گزارشات ماهانه طرح	

بخش سوم:

آخرین وضعیت پیشرفت کل طرح

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳
		صفحه: ۲۲ از ۷۰

۱-۳- پیشرفت زمانی طرح

وضعیت پیشرفت زمانی طرح تا این دوره به شرح زیر می باشد:

۴۲ ماه	مدت اولیه	مدیریت طرح مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	تاریخ شروع	۱۲۷۹	زمان اولیه پروژه (روز)
	پیمان		۱۴۰۳/۰۹/۰۱	تاریخ پایان اولیه	۱۳۹۷	زمان کل پروژه (روز)
۴ ماه	مدت تمدید	مهندسان مشاور شارگان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تاریخ پایان تمدید	۱۳۹۸	زمان گذشته (روز)
	شده			شده	۹۹	زمان باقی مانده (روز)

۱-۱-۳- پیشرفت فیزیکی طرح

پیشرفت فیزیکی طرح بر اساس برنامه زمان بندی بازنگری شده در ادامه ارائه گردیده است.

۲-۱-۳- پیشرفت فیزیکی طرح به تفکیک EPC

ردیف	شرح	وزن	پیشرفت تا دوره قبل			پیشرفت این دوره		پیشرفت تاکنون	
			برنامه ای	واقعی	انحراف	برنامه ای	واقعی	برنامه ای	واقعی
	کل پروژه	۱۰۰٪	۹۳.۸۷٪	۲۰.۴۸٪	-۷۳.۳۹٪	۰.۵۲٪	۰.۳۸٪	۹۴.۳۹٪	۲۰.۸۶٪
۱	مطالعات و فعالیت های اولیه	۱.۵۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۹۸.۴۸٪	-۱.۵۲٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۹۸.۴۸٪
۲	مهندسی کل	۹.۵۰٪	۹۸.۹۰٪	۶۱.۵۷٪	-۳۷.۲۶٪	۰.۴۰٪	۰.۰۷٪	۹۹.۳۰٪	۶۱.۶۴٪
۳	تدارکات کل	۴۸.۰۰٪	۹۴.۰۹٪	۱۶.۵۹٪	-۷۷.۷۰٪	۰.۵۸٪	۰.۶۴٪	۹۴.۶۷٪	۱۷.۲۳٪
۴	اجرای کل	۳۷.۰۰٪	۹۲.۷۰٪	۱۳.۰۶٪	-۷۹.۶۴٪	۰.۵۵٪	۰.۱۹٪	۹۳.۲۵٪	۱۳.۲۵٪
۵	راه اندازی	۲.۰۰٪	۸۴.۷۴٪	۰.۰۰٪	-۸۴.۷۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۸۴.۷۴٪	۰.۰۰٪
۶	آموزش	۱.۰۰٪	۸۲.۰۴٪	۰.۰۰٪	-۸۲.۰۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۸۲.۰۴٪	۰.۰۰٪
۷	خدمات عمومی و رفاهی	۱.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۵.۸۶٪	-۶۴.۱۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۵.۸۶٪

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳


صفحه: ۲۳ از ۷۰

۳-۱-۳- پیشرفت فیزیکی طرح به تفکیک واحدهای فرایندی و یوتیلیتی

ردیف	شرح	وزن	تاریخ برنامه ای		پیشرفت تا دوره قبل			پیشرفت این دوره		پیشرفت تاکنون	
			شروع	پایان	برنامه ای	واقعی	انحراف	برنامه ای	واقعی	برنامه ای	واقعی
	طرح GTPP اسلام آباد غرب	۱۰۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۳.۸۷٪	۲۰.۴۸٪	-۷۳.۳۹٪	۰.۵۲٪	۰.۳۸٪	۹۴.۳۹٪	۲۰.۸۶٪
۱	فعالیت های اولیه	۵.۰۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۸.۰۰٪	۷۵.۴۸٪	-۲۲.۵۲٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۹۸.۰۰٪	۷۵.۴۸٪
۲	واحدهای فرآیندی	۶۱.۲۱٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۰.۱۵٪	۲۳.۵۴٪	-۶۶.۶۱٪	۰.۸۵٪	۰.۶۳٪	۹۱.۰۰٪	۲۴.۱۷٪
۱-۲	واحد متانول	۲۹.۵۸٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۳.۰۵٪	-۶۶.۹۵٪	۰.۰۰٪	۱.۱۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۴.۲۰٪
۲-۲	واحد پروپیلین PVM	۱۸.۳۶٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۲۳.۸۰٪	-۷۶.۲۰٪	۰.۰۰٪	۰.۲۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۴.۰۴٪
۳-۲	واحد پلی پروپیلن	۱۳.۲۷٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۴.۵۶٪	۱.۹۶٪	-۵۲.۶۰٪	۳.۹۳٪	۰.۰۰٪	۵۸.۴۹٪	۱.۹۶٪
۳	واحدهای یوتیلیتی و آفسایت	۳۳.۷۹٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۶.۷۷٪	-۹۳.۲۳٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۶.۷۷٪
۱-۳	واحد یوتیلیتی	۲۲.۵۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۰۰.۰۰٪	۲.۸۲٪	-۹۷.۱۸٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۲.۸۲٪
۲-۳	واحد آفسایت	۱۱.۲۴٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۴.۶۹٪	-۸۵.۳۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۴.۶۹٪

۳-۱-۴- نمودار پیشرفت طرح

نمودار (S-Curve) ماهانه پیشرفت فیزیکی طرح در ادامه ارائه گردیده است:

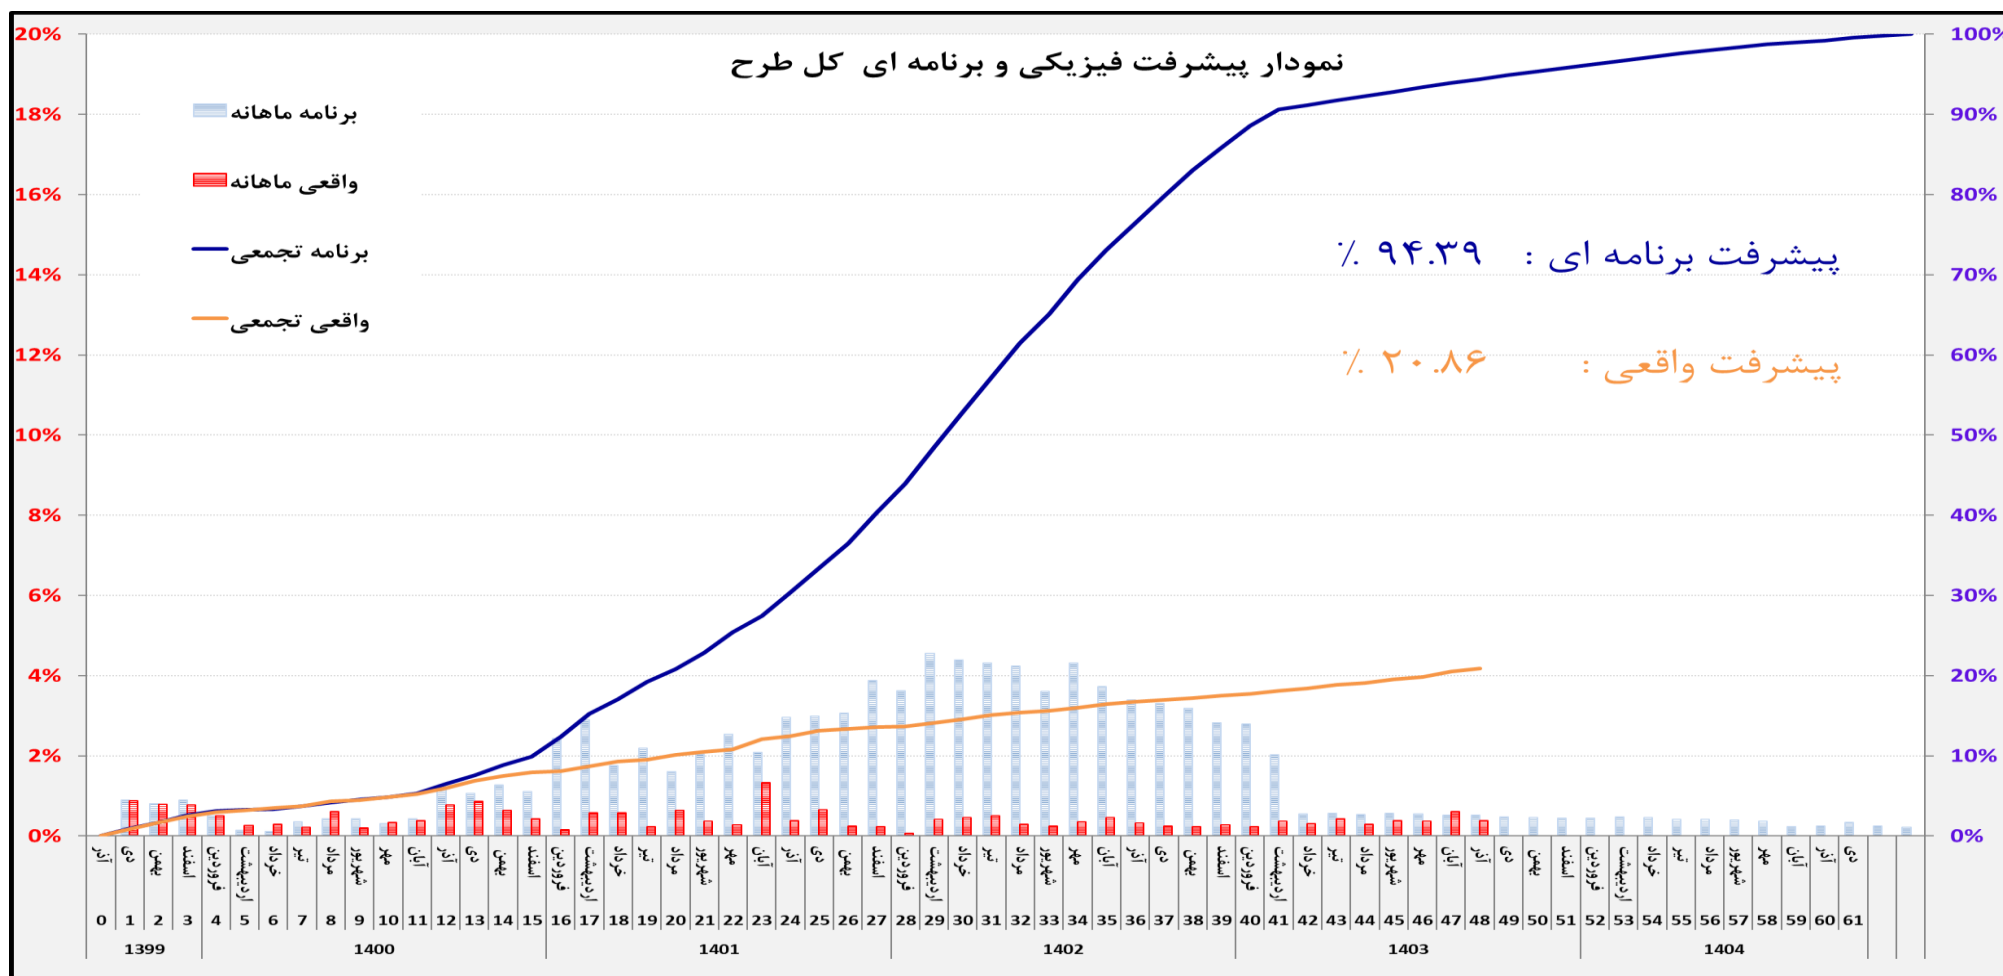

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۲۵ از ۷۰		

۲-۳- مشکلات و موانع و چالش های طرح

مسائل و مشکلات طرح	اقدامات انجام شده
تاخیر در انتخاب مشاور مطالعات خاک (ژئوتکنیک) و لرزه خیزی نسبت به برنامه زمان بندی کل طرح	- مشاور مطالعات خاک (ژئوتکنیک) و لرزه خیزی کل طرح در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انتخاب شده و مطالعات انجام شده است.
تاخیر در عقد قرارداد تامین برق	- مجوزهای لازم توسط مدیریت طرح اخذ شده - لیست پیمانکاران مجاز تهیه و به کارفرما ارائه شده
تاخیر در عقد قرارداد تامین آب	- مطالعات پایه انجام شده و اطلاعات به کارفرما ارائه شده
تاخیر در عقد قرارداد تامین گاز	- مجوزهای لازم برای سایز ۱۲ اینچ توسط مدیریت طرح اخذ شده و پیگیری انشعاب در حال انجام است - اطلاعات به کارفرما ارائه شده
طولانی بودن روند بررسی و تایید و پرداخت صورت وضعیت ها	- تهیه رويه توسط مدیریت طرح - پیگیری تسريع در بررسی و پرداخت و پیگیری از روندهای موازی
تاخیر در تحصيل اراضی مسیر فلر، آب، گاز و برق و اراضی پیشنهادی	- پیگیری و انجام مکاتبات با ارکان ذیربط
تاکید کارفرما بر انجام مطالعات پایه یوتیلیتی و آفسایت پیش از انجام پروژه EPCC	- تهیه RFQ مطالعات پایه واحد یوتیلیتی و آفسایت توسط مدیر طرح
تاخیر در انتخاب مشاور مطالعات پایه یوتیلیتی و آفسایت نسبت به برنامه زمان بندی کل طرح	- مشاور پایه در اسفند ماه ۱۴۰۱ انتخاب شده و مطالعات انجام شده است.
زمان محدود در انجام مطالعات پایه یوتیلیتی و آفسایت و تاخیر مشاور در تهیه و تکمیل مطالعات	- پیگیری توسط مدیریت طرح انجام شده و مطالعات تکمیل شده است.
تاخیر در برگزاری مناقصه EPCC واحد یوتیلیتی و آفسایت نسبت به برنامه زمان بندی	- تهیه RFQ مطالعات پایه واحد یوتیلیتی و آفسایت توسط مدیر طرح
تاکید کارفرما بر انجام مطالعات پایه واحد PP پیش از انجام پروژه EPCC	- تهیه RFQ مطالعات پایه واحد PP توسط مدیر طرح
تاخیر در برگزاری مناقصه و انتخاب مشاور مطالعات و پیمانکار EPCC واحد PP	- تهیه RFQ واحد PP توسط مدیر طرح
تاخیر نهایی سازی مطالعات پایه واحدهای متانول و PVM از سوی لایسنسور	- برگزاری جلسات منظم مهندسی با حضور لایسنسور و پیگیری از پیمانکار مشارکت در راستای تسريع در شفاف سازی موارد

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۲۶ از ۷۰		

اقدامات انجام شده	مسائل و مشکلات طرح
- مکاتبه با پیمانکار و پیگیری در جلسات با عنایت به ابلاغ توسط کارفرما - تهیه گزارش جهت طرح در شورای حل اختلاف شرکت ملی صنایع پتروشیمی	عدم شروع فعالیت های خرید واحدهای ۲۷۰۰ و ۲۹۰۰ از سوی پیمانکار GTP
- پیگیری از مشارکت بینا و استیم در راستای تسریع در نهایی سازی مدارک - ارائه برنامه جبرانی (Catch up plan) از سوی پیمانکار EPCC - ارائه Action Plan ماهانه و هفتگی از سوی پیمانکار EPCC و پیگیری تحقق موارد - پیگیری از مشارکت بینا و استیم در راستای نهایی سازی مشخصات فنی اقلام دیر تحویل و نهایی سازی پیشنهادات فنی سازندگان - پیگیری از سازندگان در راستای پیشرفت مهندسی و پیشبرد اقدامات ساخت - برگزاری جلسات هفتگی بخش های مهندسی، کالا و اجرا و جلسات هماهنگی پیشرفت کل طرح - پیگیری و برگزاری جلسات در راستای رفع موانع پروژه - ارائه راهکارهای پیشنهادی در راستای اصلاح جریان نقدینگی پروژه - تمدید مدت پیمان و ابلاغ الحاقیه شماره ۲ با توجه به پایان مدت اولیه قرارداد - ارائه Replan از سوی پیمانکار EPCC با توجه به تمدید مدت پیمان - پیگیری ارائه برنامه جبرانی (Catch up) با توجه به عقب ماندگی نسبت به برنامه Replan	تاخیر در فعالیت های پیمانکار واحد GTP به ویژه بخش های تدارکات و اجرا از جمله: - تاخیر در تهیه و نهایی سازی مدارک مهندسی - تاخیر در سفارش گذاری تجهیزات - تاخیر سازندگان در ساخت و تحویل اقلام - کندی فعالیت های اجرایی و کمبود ماشین آلات و نیروی انسانی
- برگزاری جلسات با پیمانکار و سپس جلسه با نمایندگان معاونت فنی و مهندسی نفت - ارجاع گزارش پیشنهاد مدیریت طرح جهت ارسال به شورای عالی فنی نفت - مقرر گردید در صورت ابلاغ بخشنامه ای در مورد ارز، بخشنامه فوق ملاک عمل قرار گیرد.	ادعای پیمانکار در خصوص نرخ ارز
- برگزاری جلسات متعدد و اصلاح سطوح زیرین در راستای اصلاح موارد در حد امکان - تهیه گزارش و ارائه در هیات مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی	ادعای پیمانکار در خصوص عدم تطابق بخشی از CBS قراردادی پروژه GTP با فعالیت های اجرایی
- برگزاری جلسات و ارائه راهکار به کارفرما در راستای پیشبرد پروژه - تهیه گزارش پیشنهادی مبنی بر تغییر ترم پرداختی در راستای مساعدت در انجام روند پروژه و ارائه در هیات مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی - ابلاغ الحاقیه شماره ۱ از سوی کارفرمای محترم	درخواست پرداخت های بیشتر در مراحل ابتدایی از سوی برخی سازندگان پروژه GTP

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳


صفحه: ۲۷ از ۷۰

۳-۳- مدیریت ریسک

بر اساس رویه مدیریت ریسک کل طرح، احتمال وقوع و شدت وقوع ریسک ها از ۱ (کمترین) تا ۵ (بیشترین) درجه بندی می گردد و بر همین اساس ریسکها در چهار سطح ریسک های اصلی (Critical Risks)، ریسک های مهم (High Risks)، ریسک های متوسط (Medium Risks) و ریسک های سطح پایین (Low Risks) دسته بندی می شود.

ردیف	موضوع ریسک	پیامد	ارزیابی ریسک				نحوه مدیریت ریسک	اقدام کننده
			احتمال وقوع	شدت وقوع	عدد ریسک	سطح ریسک		
۱	تعویق در اجرای واحد یوتیلیتی و آفسایت نسبت به برنامه زمان بندی با توجه به تاخیر در برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار EPCC	تاخیر در راه اندازی واحدهای فرآیندی	۵	۵	۲۵	C	پیگیری در خصوص ارائه به موقع اسناد از سوی مشاور پایه واحد یوتیلیتی و آفسایت و هماهنگی جهت برگزاری مناقصه	مدیریت طرح
۲	تاخیر در فعالیت های پیمانکار واحد GTP به ویژه بخش های تدارکات و اجرا	تاخیر در راه اندازی واحدهای متانول و PVM	۴	۵	۲۰	C	تسریع در انجام فعالیت ها و پیگیری از سازندگان	مشارکت بینا و استیم
۳	تضعیف بنیه مالی پیمانکاران و مشاوران با توجه به طولانی شدن زمان بررسی و پرداخت صورت وضعیت ها	تحت تاثیر قرار گرفتن فعالیت های پیمانکاران و مشاوران و ادعاهای آتی مشاوران و پیمانکاران	۴	۴	۱۶	C	بررسی و پرداخت صورت وضعیت ها در مهلت مقرر	کارفرما
۴	عدم شروع فعالیت های خرید واحدهای ۲۷۰۰ و ۲۹۰۰ از سوی پیمانکار GTP	تاخیر در راه اندازی واحدهای متانول و PVM	۳	۵	۱۵	C	شفاف سازی موارد قراردادی و پیگیری انجام فعالیت ها توسط مشارکت بینا و استیم	کارفرما
۵	تاخیر در تحصیل اراضی مسیر فلر، آب، گاز و برق	تعویق در عملیات اجرایی توسط پیمانکار	۳	۴	۱۲	H	مرتفع کردن مسائل حقوقی با مالکان زمین و اختصاص تیم کارشناسی حقوقی	کارفرما
۶	تاخیر در عقد قراردادهای تامین آب، برق و گاز	تاخیر در راه اندازی واحدهای فرآیندی	۳	۴	۱۲	H	پیگیری عقد قرارداد ها	کارفرما
۷	تعویق در اجرای واحد PP با توجه به تاخیر در برگزاری مناقصه پیمانکار EPCC	تاخیر در پایان طرح	۳	۳	۹	M	تصمیم گیری در خصوص زمان برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار CEPC با توجه به نحوه انجام مطالعات پایه	کارفرما


C	H	M	L
Critical Risk	High Risk	Medium Risk	Low Risk



۳-۴- پیشرفت مالی کل طرح

بر اساس اطلاعات دریافتی از کارفرما، میزان بودجه تخصیص داده شده به طرح و همچنین مقادیر هزینه شده بدین شرح می باشد:

شرح	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد هزینه شده
کل بودجه طرح	۷۰,۴۴۴	۴۷.۹۱٪
کل هزینه طرح	۳۳,۷۴۸	

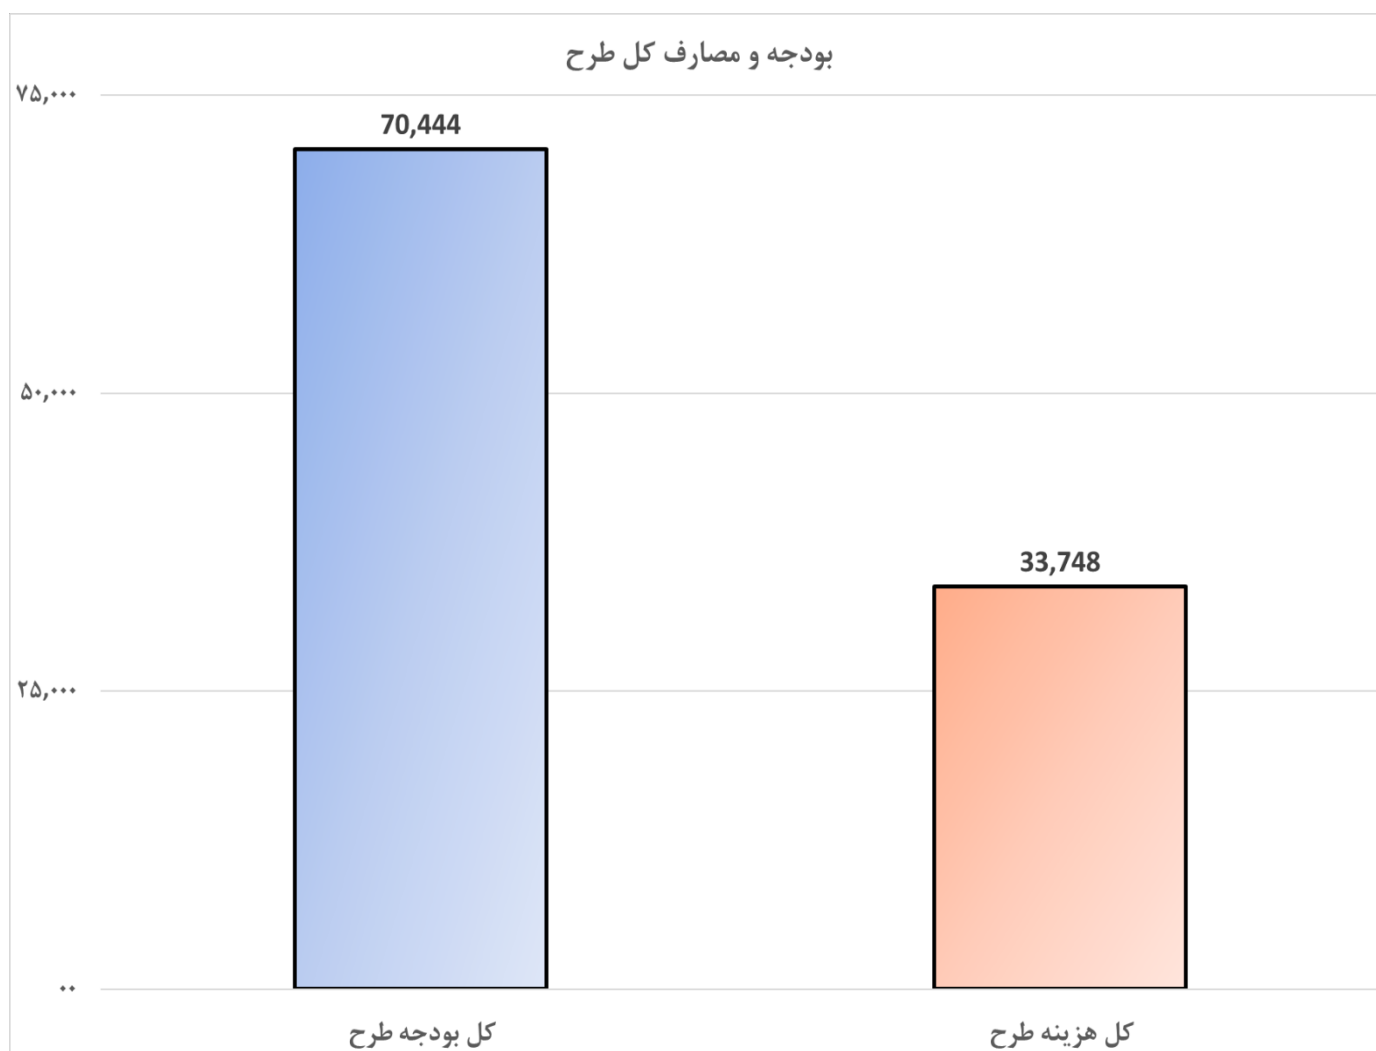

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۲۹ از ۷۰		

۳-۵- بازدیدهای انجام شده از سایت و کارخانه های سازندگان

ردیف	محل	تاریخ	هدف	نفرات
۱	سایت پروژه	۱۴۰۳/۰۸/۲۶ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۸	بازدید و تشکیل جلسه بررسی پیشرفت پروژه	آقایان: سپهرزاد، جعفری، پاک پناه، لشگری، فرزانه
۲	آکام فولاد - صفا دشت	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	جهت بازدید و پیگیری روند ساخت استیل استراکچرهای پکیج ریفرمر واحد متانول	آقایان: بحرانی، کریمان، فرزانه
۳	سایت پروژه	۱۴۰۳/۰۹/۱۸ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	بازدید از سایت- برگزاری جلسه مدیریتی	آقایان: بحرانی، لشگری، سپهرزاد، فرزانه، کریمان، جعفری

۳-۶- جلسات برگزار شده

ردیف	موضوع	تاریخ	مکان جلسه	شماره صورت جلسه	ارکان
۱	جلسه بررسی مصارف واحدهای فرآیندی و یوتیلیتی	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	شارگان	GTP-M-SHT-NPT-MG-0022	شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت مهندسی شارگان
۲	بررسی WBS مربوط به کمپرسور سنتر متانول	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	شارگان	GTP-M-SHT-BST-PR-0172	شرکت مهندسی شارگان مشارکت بینا استیم
۳	بررسی پیشرفت پروژه و وضعیت بخش اجرا	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	سایت اسلام آباد	GTP-M-SHS-BSS-MG-032	شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت مهندسی شارگان مشارکت بینا استیم مشارکت آی اس و ایکا
۴	مطالعات Sil&Hazop واحد PVM پتروشیمی اسلام آباد غرب	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	بینا	GTP-M-SHT-BST-EN-0141	شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت مهندسی شارگان مشارکت بینا استیم
۵	بررسی هفتگی وضعیت کالا	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شارگان	GTP-M-SHT-BST-PR-0173	شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت مهندسی شارگان مشارکت بینا استیم

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۳۰ از ۷۰		

ردیف	موضوع	تاریخ	مکان جلسه	شماره صورت جلسه	ارکان
۶	بررسی آخرین وضعیت پکیج ریفرمر، فیلتر تاورها	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	شارگان	GTP-M-SHT-BST-PR-0174	شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت مهندسی شارگان مشارکت بینا استیم شرکت پرگاسیران
۷	بررسی وضعیت شرکت نکانوین	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	شارگان	GTP-M-SHT-BST-PR-0175	شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت مهندسی شارگان مشارکت بینا استیم شرکت نوکانوین
۸	بررسی کامنت های مدارک خط لوله پروژه اسلام آباد غرب	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	شارگان	GTP-M-SHT-BST-EN-0142	شرکت مهندسی شارگان مشارکت بینا استیم
۹	بررسی وضعیت ساخت استیل استراکچر ریفرمر واحد متانول	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	آکام فولاد	GTP-M-SHT-BST-PR-0176	شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت مهندسی شارگان مشارکت بینا استیم مشارکت آی اس و ایکا شرکت پرگاسیران
۱۰	بررسی وضعیت راکتورهای واحد متانول	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	دفتر کارفرما	GTP-M-SHT-BST-PR-0177	شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت مهندسی شارگان مشارکت بینا استیم شرکت ماشین سازی تاشا
۱۱	بررسی وضعیت اجرایی پروژه	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	سایت	GTP-M-SHS-BSS-MG-033	شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت مهندسی شارگان مشارکت بینا استیم مشارکت آی اس و ایکا

بخش چهارم:

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ها

پروژه GTP

احداث واحد متانول، پروپیلن، مخازن متانول، خط گاز و فلر

پیمانکار: مشارکت بینا و استیم

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۳۳ از ۷۰		

۷-۳- پروژه GTP

۸-۳- پیشرفت زمانی پروژه


وضعیت پیشرفت زمانی پروژه GTP تا این دوره به شرح زیر می باشد:

۳۶ ماه	مدت اولیه پیمان	احداث واحدهای متانول و PVM (GTP)	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	تاریخ شروع	۱۰۹۵	زمان اولیه پروژه (روز)
			۱۴۰۳/۰۳/۱۸	تاریخ پایان اولیه	۲۰۰۸	زمان کل پروژه (روز)
۲۹ ماه	مدت تمدید شده	مشارکت بینا و استیم	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	تاریخ پایان تمدید شده	۱۲۸۱	زمان گذشته (روز)
					۷۲۷	زمان باقی مانده (روز)

۱-۸-۳- پیشرفت کل پروژه GTP به تفکیک EPC

شرح	وزن	پیشرفت تا دوره قبل				پیشرفت این دوره				پیشرفت تاکنون			
		برنامه	Replan	واقعی	انحراف	برنامه	Replan	واقعی	انحراف	برنامه	Replan	واقعی	انحراف
کل پروژه GTP	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۲.۴۱٪	۳۲.۶۰٪	-۱۹.۸۱٪	۰	۳.۶۲٪	۰.۳۶٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۶.۰۴٪	۳۲.۹۶٪	-۲۳.۰۸٪
مهندسی	۸.۰۰٪	۱۰۰٪	۸۶.۵۰٪	۸۰.۰۳٪	-۶.۴۸٪	۰	۱.۹۹٪	۰.۲۹٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۸.۴۹٪	۸۰.۳۱٪	-۸.۱۸٪
تدارکات	۴۸.۰۰٪	۱۰۰٪	۶۲.۱۱٪	۳۳.۷۸٪	-۲۸.۳۳٪	۰	۴.۲۳٪	۰.۲۹٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۶۶.۳۴٪	۳۴.۰۷٪	-۳۲.۲۷٪
اجرا	۴۴.۰۰٪	۱۰۰٪	۳۵.۶۴٪	۲۲.۷۰٪	-۱۲.۹۴٪	۰	۳.۲۶٪	۰.۴۴٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۸.۹۰٪	۲۳.۱۴٪	-۱۵.۷۶٪

۲-۸-۳- نمودار پیشرفت پروژه GTP

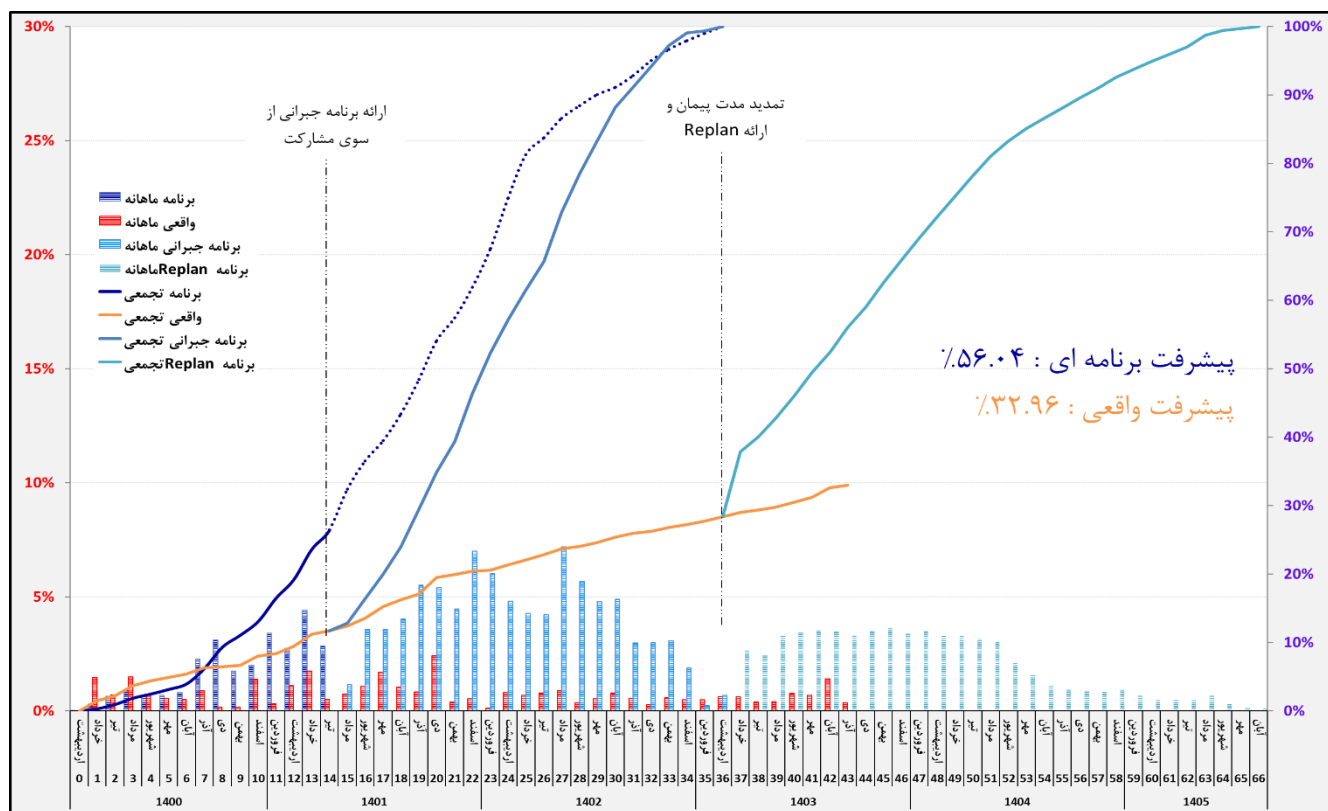

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۳۴ از ۷۰		

۳-۸-۳- پیشرفت پروژه بر اساس سطح یک WBS طرح های پتروشیمی

ردیف	شرح	وزن	پیشرفت تا دوره قبل	پیشرفت این دوره	پیشرفت تاکنون
	کل پروژه GTP با احتساب فعالیت های تمام ارکان	۱۰۰٪	۲۸.۶۰٪	۰.۶۳٪	۲۹.۲۳٪
۱-	مطالعات و فعالیت های مقدماتی	۱.۲۲٪	۹۸.۴۸٪	۰.۰۰٪	۹۸.۴۸٪
۲-	لیسانس و طراحی مهندسی	۹.۸۵٪	۸۱.۹۶٪	۰.۱۱٪	۸۲.۰۷٪
۳-	تدارکات و امور کالا	۴۸.۱۳٪	۲۶.۹۶٪	۱.۰۵٪	۲۸.۰۱٪
۴-	سیویل و ساختمان	۱۷.۰۳٪	۲۸.۸۰٪	۰.۶۸٪	۲۹.۴۸٪
۵-	نصب و پیش راه اندازی	۲۰.۵۵٪	۶.۱۰٪	۰.۰۰٪	۶.۱۰٪
۶-	راه اندازی	۱.۹۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۷-	آموزش و تجهیز نیروی انسانی	۰.۷۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸-	خدمات عمومی و رفاهی	۰.۵۴٪	۳۵.۸۶٪	۰.۰۰٪	۳۵.۸۶٪
۹-	فعالیت های پیش بینی نشده	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪

* در محاسبات پیشرفت جدول فوق تمامی فعالیت ها از مطالعات پایه و تسطیح زمین تا راه اندازی لحاظ شده است.

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۳۵ از ۷۰		

۳-۸-۴ - اهم اقدامات انجام شده تاکنون در پروژه GTP توسط مشارکت بینا و استیم

- صحنه گذاری مدارک مهندسی پایه واحد متانول و PVM
- پیشبرد مدل سازی سه بعدی (PDMS) و برگزاری جلسه 3D Model Review ۶۰ درصد واحد PVM و ۶۰ درصد واحد متانول و Tank Farm با حضور ارکان پروژه
- ارسال ۲۷۶۱ مدرک از ۳۲۸۴ مدرک پروژه به صورت تجمعی که از این میزان ۲۳۱۱ مدرک ویرایش نهایی ارسال شده است
- تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه و به روز رسانی آن
- ارائه برنامه جبرانی (Catch up plan) و به روز رسانی آن
- ارائه برنامه Replan با توجه به تمدید مدت پیمان
- انجام تجهیز کارگاه سایت پروژه
- حمل ورقهای مخازن متانول (۷۰۰۱) و مخازن روزانه متانول (۵۰۰۱ و ۵۰۰۳ و ۸۰۰۱) و مخزن بنزین (۲۶۱۵)، سقف ثابت و سقف شناور مخازن متانول، انکربولت و اقلام حفاظت کاتدیک مربوط به مخازن متانول و PVM و مخازن روزانه
- حمل انکربولت مربوط به پایپرک، بخشی از متریال استیل استراکچر پایپرکها به میزان ۱۲۵۷ تن،
- حمل ۵۷۸۴ متر لوله HDPE و ۱۷۱۷ قلم اتصالات HDPE
- حمل ۲۱۲۹۴ متر لوله فلزی و ۷۳۶۸ قلم اتصالات فلزی
- حمل استک ریفورمر و Air preheater و بخشی از استیل استراکچر ریفورمر به میزان ۲۷۲ تن
- حمل و نصب درام های ۱۰۰۱، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۵۰۰۳، ۵۰۰۶، ۶۰۰۲، ۲۰۰۵، ۵۰۰۵، ۲۱۱۲، ۲۲۱۲، ۲۲۱۳، ۲۵۱۲، ۲۵۴۲، ۲۵۵۲ و حمل درام های ۵۰۰۱، ۵۰۰۲، ۶۰۰۳، ۷۰۰۱، ۲۱۲۳، ۲۱۲۵، ۲۳۱۱، ۲۳۵۱، ۲۵۱۱، ۲۵۲۱، ۲۵۳۱، ۲۵۴۱، ۲۵۴۸ به سایت
- حمل و نصب راکتور ۲۱۱۱
- حمل و نصب تاورهای ۵۰۰۱ و ۲۳۲۱ABC و حمل تاور ۵۰۰۳ به سایت
- حمل اکسچنجرهای ۲۳۱۳ و ۶۰۰۲ به سایت
- تامین ۶،۸۸۵ تن میلگرد به سایت
- خاکبرداری به حجم ۱۰۳،۶۲۲ مترمکعب
- آماتوربندی به حجم ۶،۱۲۳ تن و بتن ریزی به حجم ۳۳،۳۷۲ مترمکعب
- ساخت مخازن به میزان ۲،۰۶۹ تن
- نصب سازه های فلزی (استراکچر) به میزان ۸۸۳ تن
- انجام لوله گذاری UG به میزان ۱۹،۲۵۱ ID

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۳۶ از ۷۰

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131


۳-۸-۵- مهندسی پروژه GTP

ردیف	شرح	پیشرفت تا دوره قبل			پیشرفت این دوره		پیشرفت تاکنون	
		برنامه ای	واقعی	انحراف	برنامه ای	واقعی	برنامه ای	واقعی
۱-۱	مهندسی پروژه GTP	۸۵.۷۵%	۷۹.۱۸%	-۶.۵۷%	۲.۷۴%	۱.۱۳%	۸۸.۴۹%	۸۰.۳۱%
۱-۱-۱	صحہ گذاری مدارک پایه (Endorsement)	۱۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰%	۰.۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰.۰۰%
۲-۱-۱	مهندسی تفصیلی	۸۶.۳۳%	۹۰.۱۹%	۳.۸۶%	۰.۷۴%	۰.۳۴%	۸۷.۰۷%	۹۰.۵۳%
۳-۱-۱	دستورالعمل ها و نقشه های As-Built	۷۲.۲۸%	۵۸.۱۴%	-۱۴.۱۴%	۱۹.۴۷%	۰.۰۰%	۹۱.۷۵%	۵۸.۱۴%

۳-۸-۵-۱- جدول پیشرفت مهندسی تفصیلی GTP

ردیف	شرح	پیشرفت تا دوره قبل			پیشرفت این دوره		پیشرفت تاکنون	
		برنامه ای	واقعی	انحراف	برنامه ای	واقعی	برنامه ای	واقعی
۱-۱-۱	مهندسی تفصیلی	۸۶.۳۳%	۹۰.۱۹%	۳.۸۶%	۰.۷۴%	۰.۳۴%	۸۷.۰۷%	۹۰.۵۳%
۱-۱-۱-۱	عمومی	۶۹.۶۰%	۶۵.۱۸%	-۴.۴۲%	۴.۰۲%	۰.۰۶%	۷۳.۶۲%	۶۵.۲۴%
۲-۱-۱-۱	متانول	۹۵.۷۷%	۹۲.۱۵%	-۳.۶۲%	۰.۵۴%	۰.۱۹%	۹۶.۳۱%	۹۲.۳۴%
۳-۱-۱-۱	پروپیلن (PVM)	۹۵.۸۵%	۸۴.۶۱%	-۱۱.۲۴%	۰.۶۸%	۰.۳۷%	۹۶.۵۳%	۸۴.۹۸%
۴-۱-۱-۱	ساختمان ها	۹۷.۵۸%	۹۵.۰۴%	-۲.۵۴%	۱.۶۹%	۰.۹۱%	۹۹.۲۷%	۹۵.۹۵%
۵-۱-۱-۱	خطوط لوله و ایستگاه تقلیل فشار	۸۹.۸۵%	۸۷.۶۰%	-۲.۲۵%	۲.۳۶%	۰.۰۰%	۹۲.۲۱%	۸۷.۶۰%
۶-۱-۱-۱	فلر	۹۱.۸۵%	۸۲.۱۹%	-۹.۶۶%	۶.۱۴%	۰.۲۷%	۹۷.۹۹%	۸۲.۴۶%
۷-۱-۱-۱	مخازن	۸۹%	۷۵.۵۱%	-۱۳.۴۱%	۲.۵۵%	۲.۱۳%	۹۱.۴۷%	۷۷.۶۴%

۳-۸-۵-۲- نمودار پیشرفت مهندسی

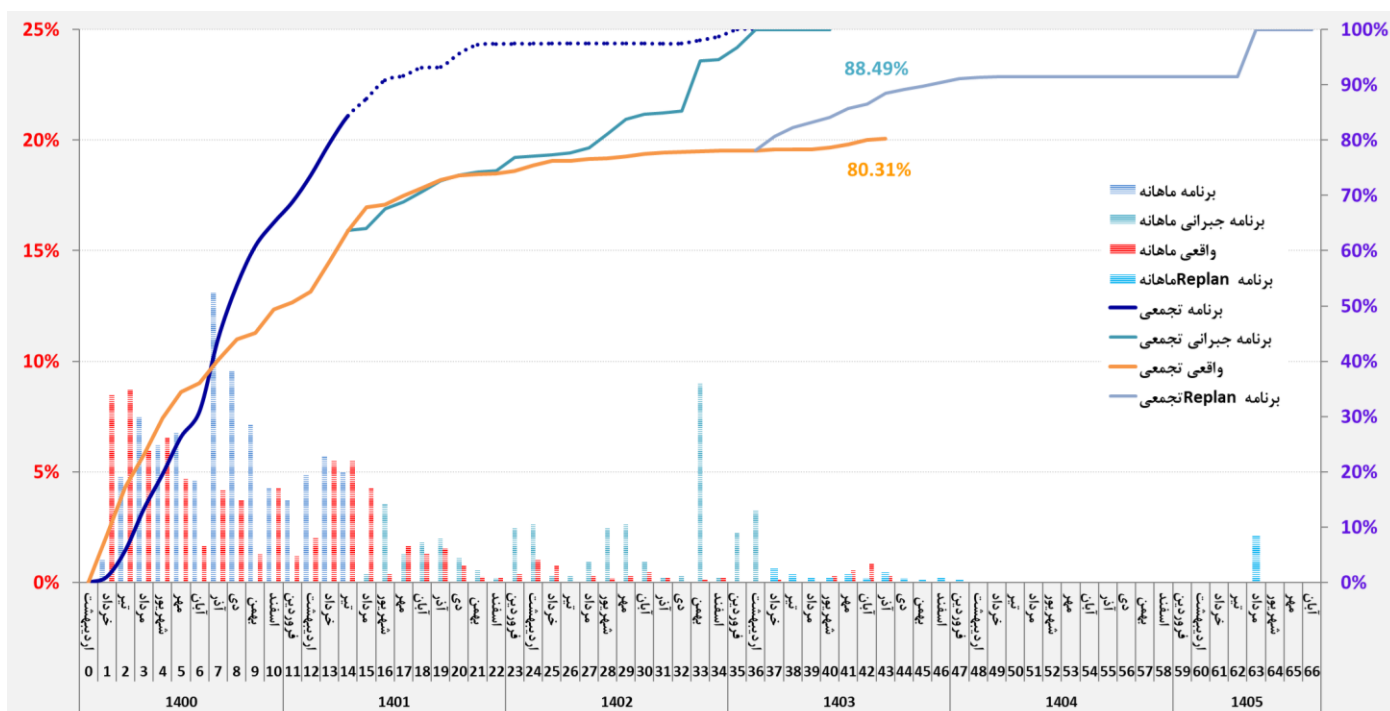

* مقادیر پیشرفت بر اساس آخرین تغییرات لیست مدارک مهندسی محاسبه شده است.

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۳۷ از ۷۰		

۳-۵-۸-۳- اهم اقدامات انجام شده در بخش مهندسی طی ماه گذشته در پروژه GTP توسط مشارکت بینا و استیم

- ارسال ویرایش اول برای ۹ مدرک و ویرایش نهایی برای ۹۱ مدرک در این دوره
- ادامه بررسی پیشنهادات فنی مبدل های حرارتی، PVM Pumps و PVM Air Cooler
- بررسی مدارک سازندگان در بخش برق Transformer

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳


صفحه: ۳۸ از ۷۰

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

۳-۵-۴- جدول وضعیت مدارک مهندسی

وضعیت مهندسی GTP								
دیسپلین	کل مدارک	کل مدارک ارسال شده	وضعیت مدارک ارسال شده					مدارک باقی مانده
			App. with com.	App.	Com.	No Com.	Under Review	
AR	۵۳	۴۹	۰	۴۴	۵	۰	۰	۴
CV	۵۱	۴۵	۶	۲۵	۱۴	۰	۰	۶
EL	۳۱۰	۲۶۸	۳۱	۱۸۰	۴۸	۰	۹	۴۲
HV	۴۳	۳۸	۱	۳۴	۰	۳	۰	۵
IN	۳۴۰	۲۵۶	۲۲	۱۴۰	۹۰	۰	۴	۸۴
MA	۱۱۴	۱۰۷	۶	۹۲	۹	۰	۰	۷
ME	۴۱۹	۴۰۰	۶	۳۸۴	۱۰	۰	۰	۱۹
PI	۳۰۲	۲۶۷	۱۶	۲۰۰	۴۹	۱	۱	۳۵
PM	۳۶	۳۰	۰	۲۲	۶	۲	۰	۶
PC	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
PR	۶۶۴	۶۵۴	۶۵	۵۵۴	۳۰	۲	۳	۱۰
QC	۱۴	۱۴	۰	۱۳	۱	۰	۰	۰
SA	۱۷۶	۱۴۱	۵	۹۸	۳۸	۰	۰	۳۵
ST	۶۶۱	۴۳۹	۱۶	۲۵۳	۱۵۹	۲	۹	۲۲۲
TE	۶۲	۴۷	۹	۲۷	۱۰	۱	۰	۱۵
HS	۵	۵	۰	۵	۰	۰	۰	۰
Total	۳۲۵۱	۲۷۶۱	۱۸۳	۲۰۷۱	۴۷۰	۱۱	۲۶	۴۹۰

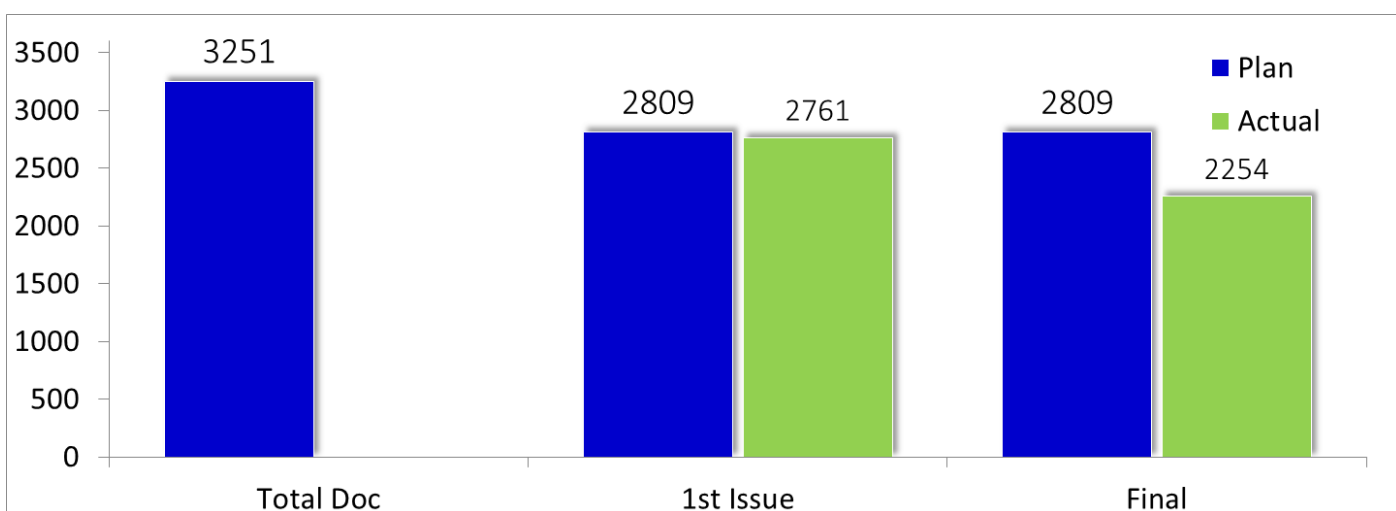

۳-۸-۵- جدول مدارک ارسالی در این دوره گزارش

دیسپلین		ارسالی در دوره گزارش		
		1st Issue	Final Issue (AFC)	Final Issue (AFP/AFD/FIN)
AR	Architectural			
CV	Civil		۱	
EL	Electrical		۴	۱۸
HV	HVAC			
IN	Instrument & Control		۱	۳
MA	Machinery	۳		۱
ME	Mechanical Fixed	۲		
PI	Piping		۲	۸
PM	Project Management			
PC	Procurement			
PR	Process	۲		۳۷
QC	Quality Control			
SA	Safety			
ST	Structural	۲	۸	۸
TE	Telecommunication			
HS	HSE			
Total		۹	۱۶	۷۵

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۴۰ از ۷۰

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131


۳-۸-۶- تدارکات پروژه GTP

ردیف	شرح	پیشرفت تا دوره قبل			پیشرفت این دوره		پیشرفت تاکنون		
		برنامه ای	واقعی	انحراف	برنامه ای	واقعی	برنامه ای	واقعی	انحراف
۲-۱	تدارکات پروژه GTP	۶۲.۱۱٪	۳۳.۷۸٪	-۲۸.۳۳٪	۴.۲۳٪	۰.۲۹٪	۶۶.۳۴٪	۳۴.۰۷٪	-۳۲.۲۷٪
۱-۲-۱	مهندسی تدارکات	۹۱.۷۰٪	۷۱.۰۳٪	-۲۰.۶۷٪	۰.۵۸٪	۰.۴۸٪	۹۲.۲۸٪	۷۱.۵۱٪	-۲۰.۷۷٪
۲-۲-۱	تامین تدارکات	۵۲.۲۴٪	۲۸.۴۵٪	-۲۳.۷۹٪	۴.۹۶٪	۰.۲۷٪	۵۷.۲۰٪	۲۸.۷۲٪	-۲۸.۴۸٪

۳-۸-۶-۱- جدول پیشرفت تدارکات پروژه


ردیف	شرح	پیشرفت تا دوره قبل			پیشرفت این دوره		پیشرفت تاکنون		
		برنامه ای	واقعی	انحراف	برنامه ای	واقعی	برنامه ای	واقعی	انحراف
۲-۱	تدارکات پروژه GTP	۶۲.۱۱٪	۳۳.۷۸٪	-۲۸.۳۳٪	۴.۲۳٪	۰.۲۹٪	۶۶.۳۴٪	۳۴.۰۷٪	-۳۲.۲۷٪
۱-۲-۱	عمومی	۵۸.۸۶٪	۴۲.۷۵٪	-۱۹.۲۰٪	۳.۰۹٪	۰.۰۵٪	۶۱.۹۵٪	۴۲.۸۰٪	-۱۹.۱۵٪
۲-۲-۱	متانول	۶۵.۱۴٪	۳۴.۴۷٪	-۳۵.۵۵٪	۴.۸۸٪	۱.۷۷٪	۷۰.۰۲٪	۳۶.۲۴٪	-۳۳.۷۸٪
۳-۲-۱	پروپیلن (PVM)	۴۵.۹۱٪	۲۵.۷۷٪	-۲۴.۷۰٪	۴.۵۶٪	۰.۳۲٪	۵۰.۴۷٪	۲۶.۰۹٪	-۲۴.۳۸٪
۴-۲-۱	ساختمان ها	۴.۲۴٪	۰.۰۰٪	-۱۵.۵۹٪	۱۱.۳۵٪	۰.۰۰٪	۱۵.۵۹٪	۰.۰۰٪	-۱۵.۵۹٪
۵-۲-۱	خطوط لوله و ایستگاه تقلیل فشار	۵.۰۰٪	۰.۰۰٪	-۵.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵.۰۰٪	۰.۰۰٪	-۵.۰۰٪
۶-۲-۱	فلر	۵.۰۰٪	۰.۰۰٪	-۱۲.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵.۰۰٪	۰.۰۰٪	-۵.۰۰٪
۷-۲-۱	مخازن	۸۰.۲۰٪	۶۴.۶۷٪	-۱۷.۸۷٪	۲.۳۴٪	۰.۰۰٪	۸۲.۵۴٪	۶۴.۶۷٪	-۱۷.۸۷٪

۳-۸-۶-۲- نمودار پیشرفت تدارکات GTP

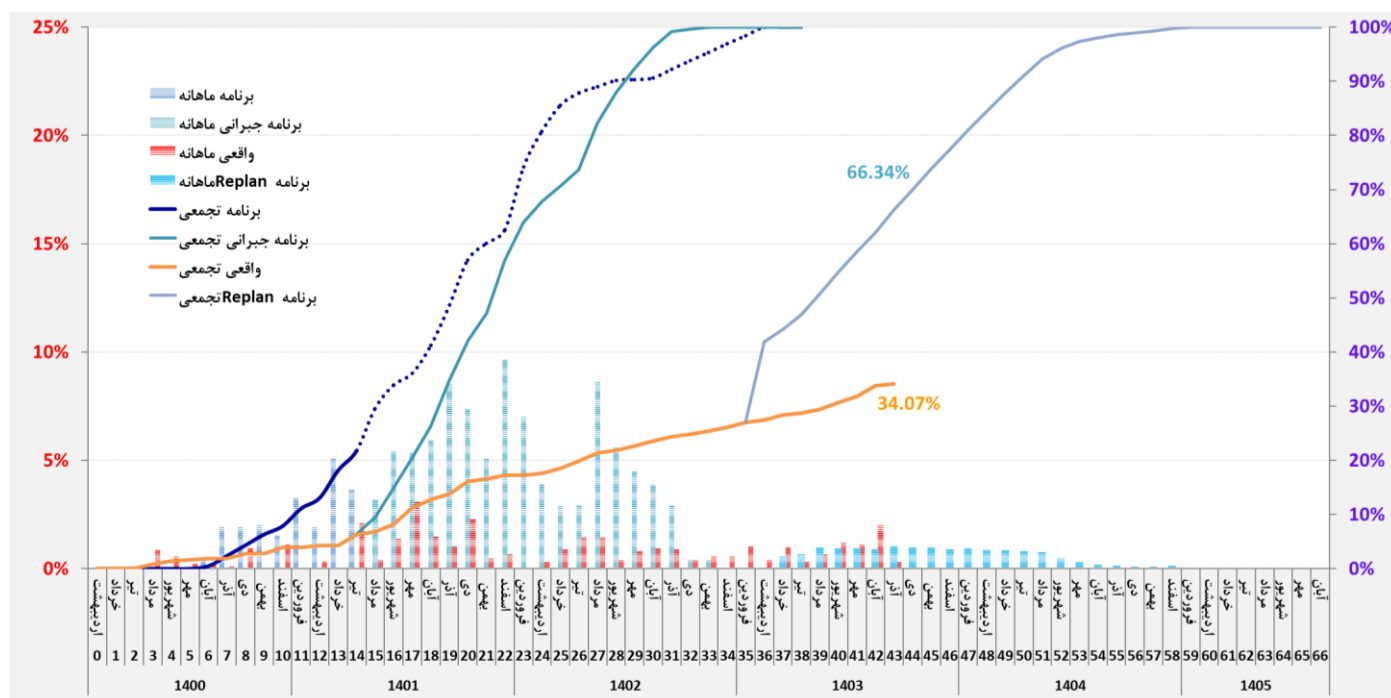

۳-۶-۸-۳- جدول آماری وضعیت تدارکات GTP

وضعیت تدارکات GTP											
Discipline	Total Prc. Items	MR Approved		Floating MRs		TBEs		PO Placement		Delivery at Site	
		Plan	Issued	Plan	Issued	Plan	Issued	Plan	Issued	Plan	Delivered
EL	۳۶	۳۶	۲۸	۳۶	۲۸	۳۶	۴	۳۶	۴	۳۶	۱
HV	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۰	۲	۰	۲	۰
IN	۷۳	۷۳	۷۰	۷۳	۷۰	۷۳	۱	۷۳	۱	۷۲	۰
MA	۱۱	۱۱	۱۰	۱۱	۱۰	۱۱	۵	۱۱	۵	۱۱	۰
ME	۶۱	۶۱	۵۶	۶۱	۵۶	۶۱	۳۸	۶۱	۳۸	۶۱	۶
PI	۳۲	۳۲	۲۸	۳۲	۲۸	۳۲	۱۳	۳۲	۱۳	۳۵	۱۰
PR	۳	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۲	۰
SA	۲۳	۲۳	۲۱	۲۳	۲۱	۲۳	۰	۲۳	۰	۱۹	۰
ST	۴	۴	۳	۴	۳	۴	۳	۴	۳	۳	۳
TE	۶	۶	۴	۶	۴	۶	۱	۶	۱	۶	۰
2 Years	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
Total	۲۵۱	۲۵۱	۲۲۲	۲۵۱	۲۲۲	۲۵۱	۶۵	۲۵۱	۶۵	۲۵۱	۲۰

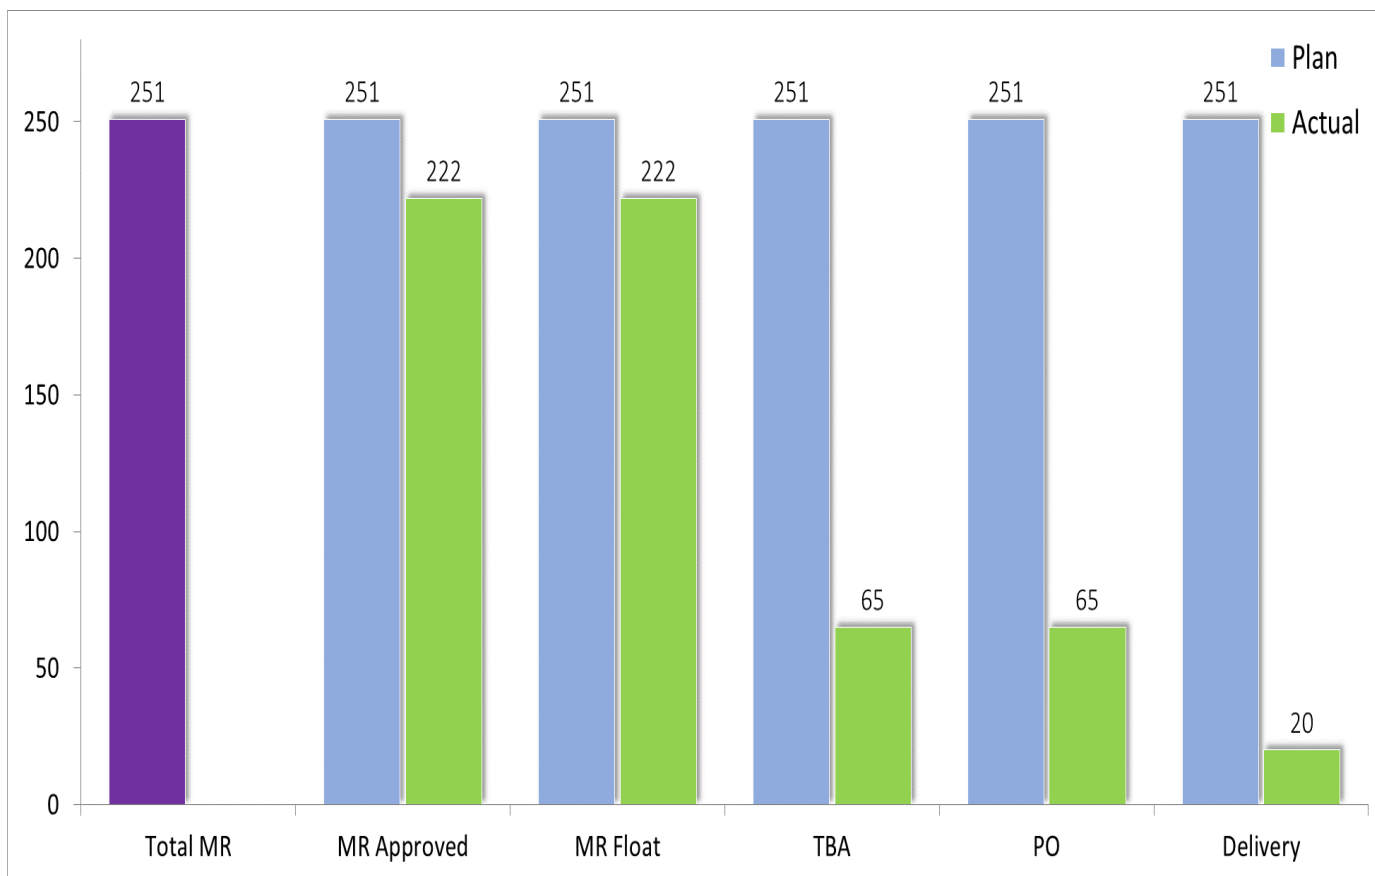

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۴۲ از ۷۰		

۳-۸-۶-۴ - اهم اقدامات انجام شده تدارکات پروژه GTP طی ماه گذشته توسط مشارکت بینا و استیم

- شروع رنگ لایه دوم تاور ۲۳۱۱ واحد PVM
- انجام Performance Test مربوط به پمپ های گریز از مرکز واحد متانول
- بارگیری و حمل سازه فلزی فاز ۵ ریفرمر
- ارسال TBE بسته خرید Methanol Super Heater
- ادامه فرآیند ساخت سازه های فلزی ریفرمر فاز ۲ (۱۰۰ تن) و فاز ۱.۱ الی ۱.۳ (۱۳۰ تن)
- شروع حمل Air preheater مربوط به بسته خرید ریفرمر
- حمل Air preheater مربوط به بسته خرید ریفرمر
- بارگیری و حمل درام ۲۰۰۶
- پیگیری اخذ پیشنهاد فنی جهت نهایی سازی پکیج های کاری ذیل:

۳-۸-۷- ساختمان، نصب، راه اندازی پروژه GTP

* Reactor Product Gas Heat Recovery Package	* Centrifugal Compressor - PVM
* Condensate Treatment Package	* Blast Proof Doors
* Methanol Super Heater	* Lighting Poles
* NGR Methanol & PVM	* On/Off Valves Methanol
* Lighting Fixtures	* Electrical Trays, Ladders & Cable Supports
* Socked outlet	* Let Down Station
* Junction Box	* Centrifugal Pump PVM (Part 2)
* Mixer PVM	* Gasoline Inhabiter
* Radio system	* Morphiline Dosing
* Process Water Boiler	* MV Cable
* Oxygen Scavenger Dosing	* Methanol Polishing Package
* Phosphate Dosing	* Analyzers Transmitter Methanol & PVM
* conduit & Accessories	* Safety Valves- Methanol
* NAOH Dosing	* Emergency Diesel Generator
* Silencer	* MV Bus Duct (PVM)
* Ejector	
* HVAC	
* UPS Methanol & PVM	
* Control Valves- Methanol	
* Metering Pumps- Methanol	

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۴۳ از ۷۰


گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

۳-۸-۷-۱- جدول پیشرفت ساختمان، نصب، راه اندازی GTP

ردیف	شرح	پیشرفت تا دوره قبل			پیشرفت این دوره			پیشرفت تاکنون		
		Replan	واقعی	انحراف	Replan	واقعی	انحراف	Replan	واقعی	انحراف
۳-۱	اجرای پروژه GTP	۳۵.۶۴٪	۲۲.۷۰٪	-۱۲.۹۴٪	۳.۲۶٪	۰.۴۴٪	-۲.۸۰٪	۳۸.۹۰٪	۲۲.۱۴٪	-۱۵.۷۶٪
۱-۳-۱	ساخت و نصب واحدهای متانول، PVM، مخازن، فلر و ایستگاه گاز	۲۸.۰۵٪	۱۵.۹۰٪	-۱۲.۱۵٪	۳.۷۷٪	۰.۴۶٪	-۳.۳۱٪	۳۱.۸۲٪	۱۶.۳۶٪	-۱۵.۴۶٪
۲-۳-۱	مهندسی کارگاهی و کنترل پروژه	۵۲.۴۹٪	۳۹.۷۶٪	-۱۲.۷۳٪	۲.۵۹٪	۰.۵۶٪	-۱.۹۴٪	۵۵.۰۸٪	۴۰.۳۲٪	-۱۴.۷۶٪
۳-۳-۱	پیش راه اندازی، راه اندازی و تست عملکردی	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۴-۳-۱	تجهیز کارگاه	۶۰.۷۷٪	۴۸.۰۸٪	-۱۲.۶۹٪	۲.۰۱٪	۰.۸۳٪	-۱.۱۸٪	۶۲.۷۸٪	۴۸.۹۱٪	-۱۳.۸۷٪
۵-۳-۱	برچیدن کارگاه	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۶-۳-۱	آموزش	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۷-۳-۱	HSE	۴۵.۳۱٪	۲۰.۰۱٪	-۲۵.۳۰٪	۲.۷۸٪	۰.۰۸٪	-۲.۷۰٪	۴۸.۰۹٪	۲۰.۰۹٪	-۲۸.۰۰٪
۸-۳-۱	خدمات به کارفرما	۶۸.۳۹٪	۴۹.۲۹٪	-۱۹.۱۰٪	۱.۵۸٪	۰.۴۷٪	-۱.۱۱٪	۶۹.۹۷٪	۴۹.۷۶٪	-۲۰.۲۱٪
۹-۳-۱	ساختمان DCC	۹۷.۹۷٪	۶۲.۸۷٪	-۳۵.۱۰٪	۱.۳۸٪	۰.۰۲٪	-۱.۳۶٪	۹۹.۳۵٪	۶۲.۸۹٪	-۳۶.۴۶٪

۳-۸-۷-۲- نمودار پیشرفت ساختمان، نصب، راه اندازی GTP

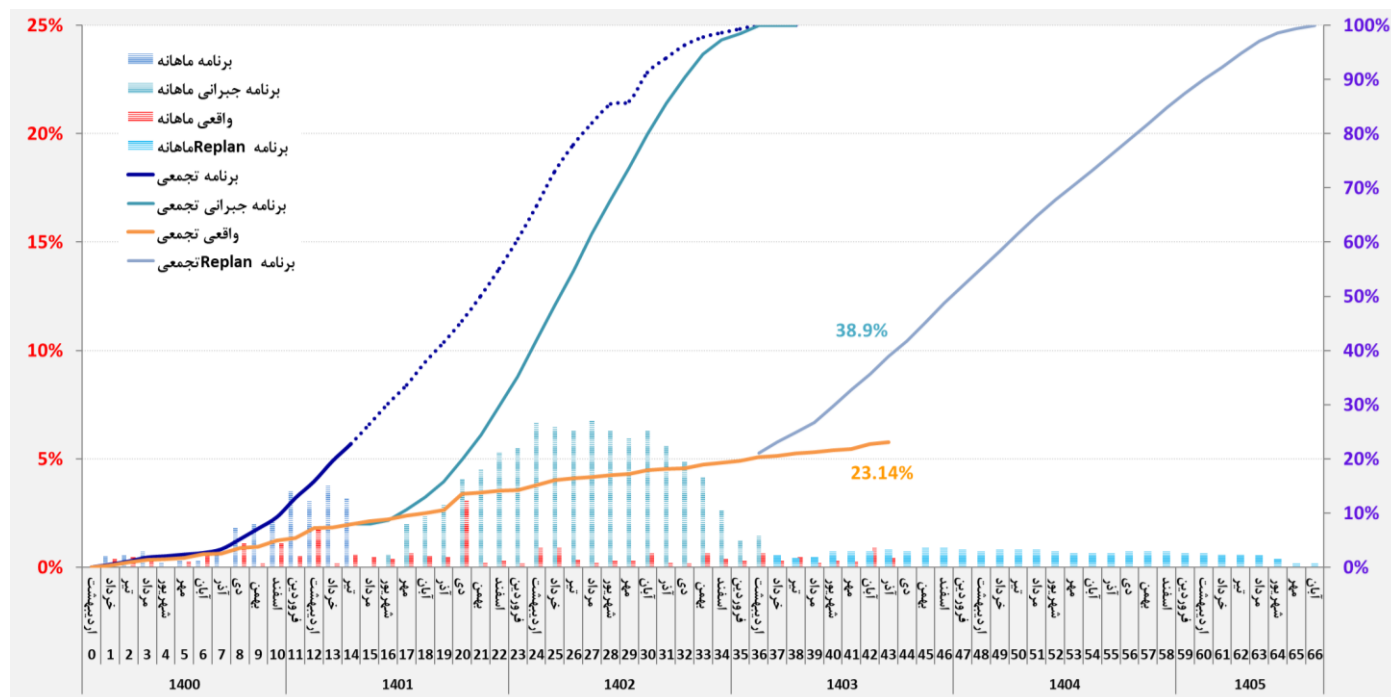

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۴۴ از ۷۰		

۳-۷-۸-۳- جدول احجام ساختمان، نصب، راه اندازی GTP

وضعیت احجام اجرایی GTP							
ردیف	عنوان	واحد	احجام کل	انجام شده	انجام شده %	برنامه ای	برنامه ای %
۱	سیویل - خاکبرداری	M3	۱۱۲,۸۶۰	۱۰۳,۶۲۲	۹۱.۸۱%	۱۱۲,۸۶۰	۱۰۰.۰۰%
۲	سیویل - آرماتوربندی	Ton	۷,۰۸۶	۶,۱۲۳	۸۶.۴۱%	۷,۰۸۶	۱۰۰.۰۰%
۳	سیویل - بتن ریزی	M3	۵۴,۵۸۷	۳۳,۳۷۲	۶۱.۱۴%	۵۴,۵۸۷	۱۰۰.۰۰%
۴	نصب سازه فلزی	Ton	۷,۸۴۳	۸۸۳	۱۱.۲۶%	۷,۸۴۳	۱۰۰.۰۰%
۵	لوله کشی UG	ID	۵۹,۲۲۰	۱۹,۲۵۱	۳۲.۵۱%	۵۹,۲۲۰	۱۰۰.۰۰%
۶	لوله کشی AG	ID	۴۳۳,۳۹۲	۲۰,۱۲۴	۴.۶۴%	۴۳۳,۳۹۲	۱۰۰.۰۰%
۷	ساخت تانک	Ton	۷,۱۵۰	۲,۰۶۹	۲۸.۹۴%	۷,۱۵۰	۱۰۰.۰۰%
۸	نصب تجهیزات ثابت - Fix Equipment	Ton	۱۴,۹۶۷	۳۹۵	۲.۶۴%	۱۴,۹۶۷	۱۰۰.۰۰%
۹	نصب تجهیزات دوار - Rotary Equipment	Ton	۴۷۸			۴۷۸	۱۰۰.۰۰%
۱۰	کابل کشی برق	M-L	۴۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰%
۱۱	کابل کشی ابزار دقیق	M-L	۲۵۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰%

* احجام اجرایی کل بر اساس مقادیر اولیه بوده و پس از تکمیل نقشه های اجرایی توسط پیمانکار، تدقیق خواهد شد.

۳-۷-۸-۴- اهم اقدامات انجام شده بخش ساختمان، نصب، راه اندازی طی ماه گذشته در پروژه GTP توسط مشارکت بینا و استیم

- ساختمان ساب استیشن: ادامه عملیات اجرای وال پست و دیوار چینی ، ادامه عملیات اجرای پلاستر
- پایپرک: تکمیل عملیات اجرای آرماتوربندی ، نصب پلیت ، قالب بندی و بتن ریزی سرستون های پایپرک ۰۰۳ ، ادامه عملیات آرماتوربندی فونداسیون پایپرک ۰۰۵ ناحیه PVM ، ادامه عملیات اجرای قالب بندی و نصب پلیت های سرستون پایپرک ۰۰۱ پارت ۱ ، ۴ ، ادامه عملیات اجرای قالب بندی و نصب پلیت های سرستون پایپرک ۰۰۱ پارت ۱ ، ۴ ، ادامه عملیات اجرای آرماتوربندی تیر های مرحله دوم پایپرک ۰۰۲ پارت ۱، شروع عملیات اجرای حمل متریال استراکچر پایپرک ۰۰۳
- مخازن روزانه متانول: ادامه عملیات اجرای جوشکاری ورق های سقف مخزن A,CY۰۰۱
- مخازن روزانه: ادامه عملیات اجرای حفاری و بتن ریزی شمع های تاور ۵۰۰۲
- ادامه عملیات اجرای ولوپیت ها و منهول های ناحیه PVM و TANKAGE
- ادامه عملیات اجرای نصب استراکچر بریج ۰۰۲
- ادامه عملیات اجرای قلوه ریزی درام و پیت ۷۰۰۱

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۴۵ از ۷۰

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

- ادامه عملیات اجرای ولوپیت ها و منهول های ناحیه PVM و TANKAGE

- نصب درام های ۲۰۰۵ و ۵۰۰۵ ناحیه متانول

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131


منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۴۶ از ۷۰

۳-۸-۸- مدیریت ارزش کسب شده

بر اساس محاسبات روش مدیریت ارزش کسب (Earned Value Management)، شاخص های موردنظر بدین ترتیب تعریف می گردد:

- ارزش برنامه ای تجمعی - Planned value: حاصل ضرب پیشرفت برنامه ای در مبلغ کل برآورد
 - ارزش کسب شده تجمعی - Earned Value: حاصل ضرب پیشرفت واقعی در مبلغ کل برآورد
 - هزینه واقعی - Actual Cost: هزینه واقعی صرف شده در پروژه (بر اساس خالص صورت-وضعیت های پرداخت شده به علاوه مبالغ پیش پرداخت)
 - شاخص عملکرد برنامه SPI: ارزش کسب شده تجمعی تقسیم بر ارزش برنامه ای تجمعی
 - شاخص عملکرد هزینه CPI: ارزش کسب شده تجمعی تقسیم بر هزینه واقعی
 - شاخص تخمین قیمت تمام شده EAC: هزینه واقعی به علاوه مبلغ کل برآورد منهای ارزش کسب شده تجمعی
- جدول محاسبات شاخص های مدیریت ارزش کسب شده: (مقادیر به میلیارد ریال می باشد)

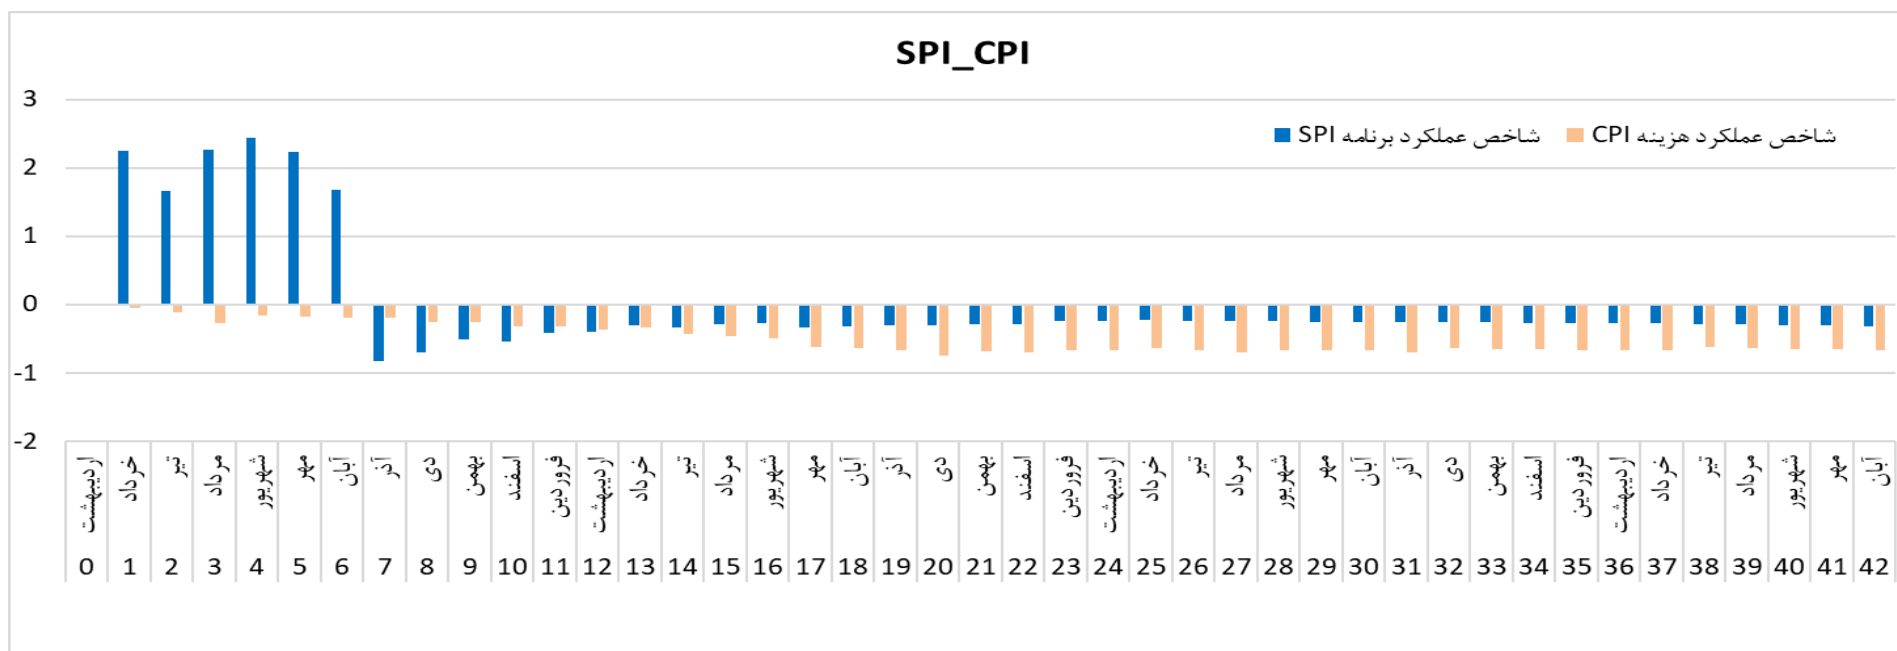

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۴۷ از ۷۰

نام و عنوان شاخص	روش محاسبه	۱۴۰۰										
		۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
		ارز	ار	ار	ار	ار	ار	ار	ار	ار	ار	ار
Planned value- ارزش برنامه‌ای تجمعی	% Plan X Total Estimate	۰	۱۰۱	۲۸۶	۵۴۵	۷۰۳	۸۸۹	۱,۳۳۶	۲,۹۰۴	۴,۶۳۲	۶,۳۵۸	۷,۷۵۷
Earned Value - ارزش کسب شده تجمعی	% Actual X Total Estimate	۰	۲۲۷	۴۷۴	۱,۲۳۰	۱,۷۱۸	۱,۹۸۹	۲,۲۳۹	۲,۳۸۶	۳,۲۲۷	۳,۲۷۹	۴,۲۵۳
Actual Cost - هزینه واقعی	خالص صورت وضعیت ها + پیش پرداخت	۰	۴,۰۳۸	۴,۰۸۰	۴,۶۱۳	۱۰,۹۸۷	۱۱,۰۷۹	۱۱,۲۵۲	۱۲,۱۱۷	۱۲,۸۴۲	۱۳,۰۰۲	۱۳,۰۰۲
SPI عملکرد برنامه	EV/PV	۰	۲.۲۵	۱.۶۶	۲.۲۶	۲.۴۴	۲.۲۴	۱.۶۸	۰.۸۲	۰.۷۰	۰.۵۲	۰.۵۵
CPI عملکرد هزینه	EV/AC	۰	۰.۰۶	۰.۱۲	۰.۲۷	۰.۱۶	۰.۱۸	۰.۲۰	۰.۲۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰.۳۳
EAC شاخص تخمین قیمت تمام شده	AC +(BAC -EV)	۸۱,۷۰۹	۸۵,۵۲۰	۸۵,۳۱۵	۸۵,۰۹۱	۹۰,۹۷۸	۹۰,۷۹۸	۹۰,۷۲۲	۹۱,۴۴۰	۹۱,۳۲۴	۹۱,۴۳۱	۹۰,۴۵۸

نام و عنوان شاخص	روش محاسبه	۱۴۰۱										
		۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱
		ارز	ار	ار	ار	ار	ار	ار	ار	ار	ار	ار
Planned value- ارزش برنامه‌ای تجمعی	% Plan X Total Estimate	۱۰,۴۶۲	۱۲,۲۸۸	۱۶,۲۴۵	۱۹,۱۸۶	۲۴,۷۸۰	۲۸,۲۰۷	۳۰,۱۷۰	۳۴,۱۶۳	۳۹,۴۹۹	۴۵,۴۴۶	۴۸,۱۸۹
Earned Value - ارزش کسب شده تجمعی	% Actual X Total Estimate	۴,۳۵۸	۴,۹۰۱	۵,۰۳۶	۶,۵۷۴	۷,۰۰۶	۷,۹۶۱	۱۰,۰۹۰	۱۱,۱۳۳	۱۱,۸۹۱	۱۳,۸۳۵	۱۴,۱۸۲
Actual Cost - هزینه واقعی	خالص صورت وضعیت ها + پیش پرداخت	۱۳,۳۱۸	۱۳,۳۱۸	۱۵,۱۷۶	۱۵,۱۷۶	۱۵,۱۷۶	۱۶,۲۵۶	۱۶,۲۵۶	۱۷,۵۳۶	۱۷,۸۷۱	۱۸,۳۰۶	۲۰,۷۶۰
SPI عملکرد برنامه	EV/PV	۰.۴۲	۰.۴۰	۰.۳۱	۰.۳۴	۰.۲۸	۰.۲۸	۰.۳۳	۰.۳۳	۰.۳۰	۰.۳۰	۰.۲۹
CPI عملکرد هزینه	EV/AC	۰.۳۳	۰.۳۷	۰.۳۳	۰.۴۳	۰.۴۶	۰.۴۹	۰.۶۲	۰.۶۳	۰.۶۷	۰.۷۶	۰.۶۸
EAC شاخص تخمین قیمت تمام شده	AC +(BAC -EV)	۹۰,۶۶۹	۹۰,۱۲۶	۹۱,۸۴۸	۹۰,۳۱۰	۸۹,۸۷۹	۹۰,۰۰۴	۸۷,۸۷۵	۸۸,۱۱۱	۸۷,۶۸۹	۸۶,۱۷۹	۸۸,۲۸۷

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳


صفحه: ۴۸ از ۷۰

نام و عنوان شاخص	روش محاسبه	۱۴۰۲											
		۲۲	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴
		فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	
ارزش برنامه‌ای تجمعی - Planned value	% Plan X Total Estimate	۵۸,۹۵۸	۶۴,۰۴۳	۶۸,۱۴۴	۷۰,۳۷۴	۷۱,۷۸۸	۷۳,۰۶۳	۷۳,۲۴۶	۷۴,۲۶۵	۷۵,۷۲۲	۷۷,۱۰۸	۷۸,۳۷۰	۷۹,۵۲۳
ارزش کسب شده تجمعی - Earned Value	% Actual X Total Estimate	۱۴,۷۵۰	۱۵,۰۸۹	۱۵,۸۱۲	۱۶,۷۹۵	۱۷,۷۶۷	۱۸,۰۹۵	۱۸,۶۶۳	۱۹,۳۷۱	۱۹,۹۸۱	۲۰,۲۷۷	۲۰,۷۵۶	۲۱,۲۱۴
هزینه واقعی - Actual Cost	خالص صورت وضعیت ها + پیش پرداخت	۲۱,۷۸۵	۲۲,۳۷۵	۲۴,۸۳۴	۲۴,۸۳۴	۲۵,۰۶۱	۲۶,۸۹۵	۲۷,۹۰۶	۲۸,۵۵۶	۲۸,۳۴۷	۳۱,۶۵۱	۳۱,۶۲۰	۳۲,۲۶۶
شاخص عملکرد برنامه SPI	EV/PV	۰.۲۵	۰.۲۴	۰.۲۳	۰.۲۴	۰.۲۵	۰.۲۵	۰.۲۵	۰.۲۶	۰.۲۶	۰.۲۶	۰.۲۶	۰.۲۷
شاخص عملکرد هزینه CPI	EV/AC	۰.۶۸	۰.۶۷	۰.۶۴	۰.۶۸	۰.۷۱	۰.۶۷	۰.۶۷	۰.۶۸	۰.۷۰	۰.۶۴	۰.۶۶	۰.۶۶
شاخص تخمین قیمت تمام شده EAC	AC+(BAC-EV)	۸۸,۷۴۳	۸۸,۹۹۵	۹۰,۷۳۱	۸۹,۷۴۸	۸۹,۰۰۳	۹۰,۵۰۸	۹۰,۹۵۲	۹۰,۸۹۴	۹۰,۰۷۴	۹۳,۰۸۲	۹۲,۵۷۳	۹۲,۷۶۱

نام و عنوان شاخص	روش محاسبه	۱۴۰۳							
		۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲
		فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	مهر	آبان	
ارزش برنامه‌ای تجمعی - Planned value	% Plan X Total Estimate	۸۰,۶۲۷	۸۱,۷۰۹	۸۱,۷۰۹	۸۱,۷۰۹	۸۱,۷۰۹	۸۱,۷۰۹	۸۱,۷۰۹	۸۱,۷۰۹
ارزش کسب شده تجمعی - Earned Value	% Actual X Total Estimate	۲۱,۹۱۰	۲۲,۲۶۷	۲۲,۹۴۴	۲۳,۲۴۴	۲۳,۷۰۳	۲۴,۵۵۶	۲۵,۳۱۰	۲۶,۷۳۴
هزینه واقعی - Actual Cost	خالص صورت وضعیت ها + پیش پرداخت	۳۲,۸۰۷	۳۲,۹۲۰	۳۴,۴۳۱	۳۷,۲۸۹	۳۷,۲۸۹	۳۷,۸۴۷	۳۸,۹۷۰	۴۰,۱۲۹
شاخص عملکرد برنامه SPI	EV/PV	۰.۲۷	۰.۲۷	۰.۲۸	۰.۲۸	۰.۲۹	۰.۳۰	۰.۳۱	۰.۳۳
شاخص عملکرد هزینه CPI	EV/AC	۰.۶۷	۰.۶۸	۰.۶۷	۰.۶۲	۰.۶۴	۰.۶۵	۰.۶۵	۰.۶۷
شاخص تخمین قیمت تمام شده EAC	AC+(BAC-EV)	۹۲,۶۰۵	۹۲,۳۶۱	۹۳,۱۹۶	۹۵,۷۵۴	۹۵,۲۹۵	۹۵,۰۰۰	۹۵,۳۶۹	۹۵,۱۰۳

*: مقادیر مربوط به شاخص CPI بر مبنای آخرین مبالغ پرداختی شامل پیش پرداخت و خالص صورت وضعیت تایید شده از سوی کارفرمای محترم تهیه شده است.

نمودار ارزش کسب شده پروژه در مقایسه با مقدار برنامه ای و هزینه واقعی:

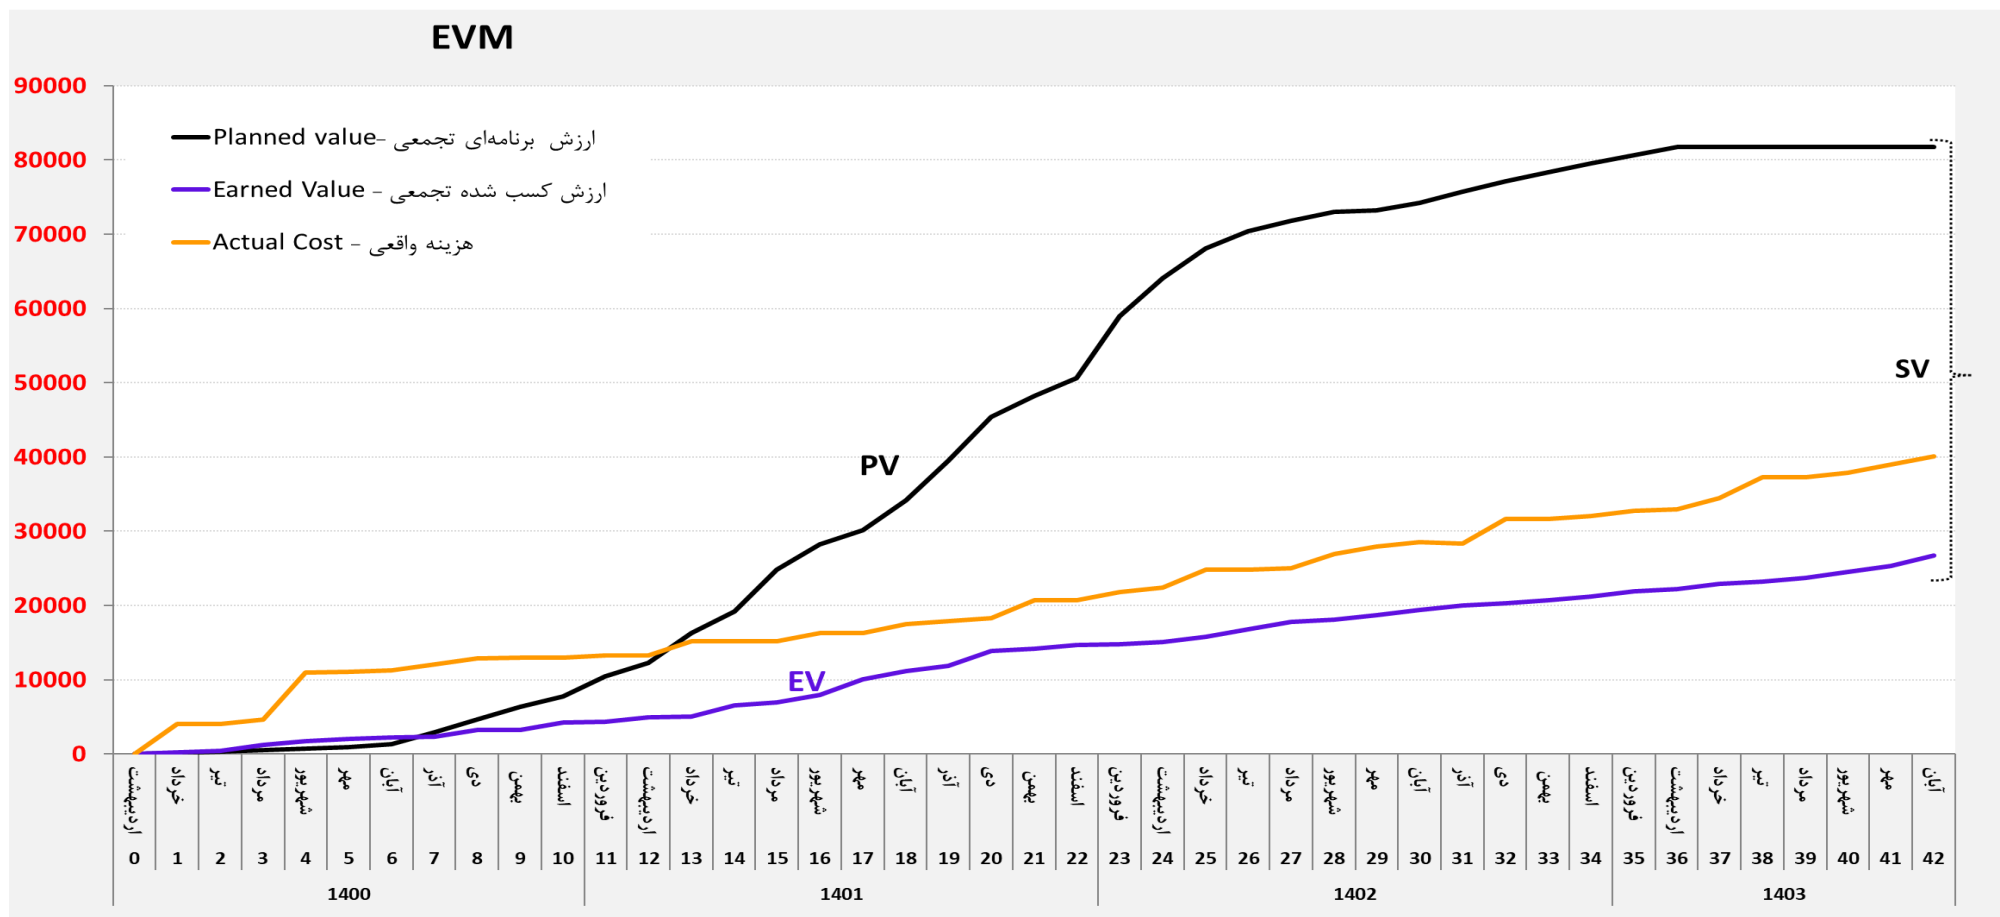

*: مقادیر مربوط به شاخص AC بر مبنای آخرین صورت وضعیت تایید شده از سمت کارفرمای محترم تکمیل شده است.

پروژه مطالعات پایه UTY

پروژه انجام طراحی مهندسی پایه، برآورد احجام، تخمین قیمت و
تهیه اسناد مناقصه EPCC واحد های یوتیلیتی و آفسایت

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۵۱ از ۷۰		

۹-۳- پروژه مطالعات پایه UTY

۱-۹-۳- پیشرفت زمانی پروژه


وضعیت پیشرفت زمانی پروژه UTY تا این دوره به شرح زیر می باشد:

مدت اولیه	مطالعات پایه یوتیلیتی و آفاسایت	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	تاریخ شروع	۱۵۴	زمان اولیه پروژه (روز)
پیمان		۱۴۰۲/۰۶/۱۳	تاریخ پایان اولیه	۳۳۲	زمان کل پروژه (روز)
مدت تمدید شده	مهندسان مشاور هیبردان	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	تاریخ پایان تمدید شده	پایان یافته	زمان گذشته
۶ ماه					زمان باقی مانده

۲-۹-۳- پیشرفت کل پروژه مطالعات پایه UTY:

ردیف	شرح	وزن	پیشرفت تا دوره قبل				پیشرفت این دوره			پیشرفت تاکنون		
			برنامه ای	Replan	واقعی	انحراف	برنامه ای	Replan	واقعی	برنامه ای	Replan	انحراف
۰	کل پروژه UTY	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
۱	مهندسی	۹۸.۴۱٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
۱-۱	مهندسی پایه	۹۸.۸۷٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
۱-۲	مطالعات مفهومی	۱.۱۳٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
۲	اسناد مناقصه	۱.۵۹٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪

۳-۹-۳- نمودار پیشرفت فیزیکی و برنامه ای مطالعات پایه UTY:

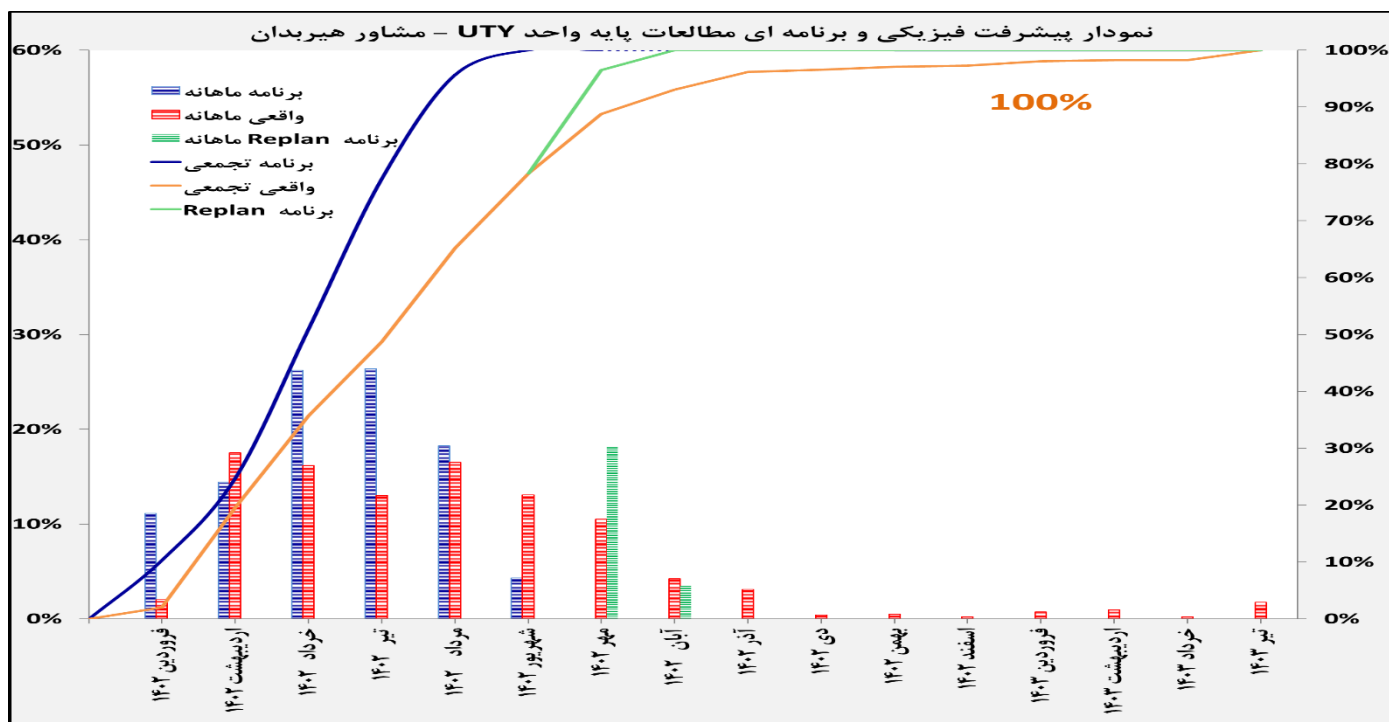

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۵۲ از ۷۰		

۳-۹-۴- اهم اقدامات انجام شده تاکنون در پروژه مطالعات پایه UTU :

- تهیه مدارک مهندسی به تعداد ۵۲۶ از ۵۲۶ کل مدارک که تمامی مدارک ویرایش نهایی ارسال شده است.
- برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص مغایرت های موجود در مدرک Tie-in Point پروژه
- ارسال آخرین ویرایش مدرک TIE IN LIST شرکت طراحی و ساخت بینا به شرکت هیروبان
- بررسی و محاسبه مجدد سایز خط لوله انتقال سوخت گاز به توربین ها
- برگزاری جلسه در خصوص اسناد مناقصه EPCC

۵-۹-۳- جدول پیشرفت بخش مهندسی UTU به تفکیک دیسپلین ها :

پیشرفت تاکنون				پیشرفت این دوره			پیشرفت تا دوره قبل				وزن	شرح	ردیف
انحراف	واقعی	Replan	برنامه ای	واقعی	Replan	برنامه ای	انحراف	واقعی	Replan	برنامه ای			
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	مهندسی	۱
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹۸.۸۷٪	مهندسی پایه	۱-۱
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰.۴۸٪	عمومی	۱-۱-۱
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۸.۲۸٪	فرآیند	۱-۱-۲
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۱.۶۶٪	ایمنی	۱-۱-۳
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۷.۶۸٪	پاییننگ	۱-۱-۴
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲.۳۶٪	مکانیکال	۱-۱-۵
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۶.۵۳٪	ماشینری	۱-۱-۶
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵.۷۰٪	HVAC	۱-۱-۷
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸.۲۵٪	برق	۱-۱-۸
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۸۶٪	مخابرات	۱-۱-۹
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹.۱۱٪	ابزار دقیق	۱-۱-۱۰
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲.۳۳٪	سیویل	۱-۱-۱۱
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲.۷۲٪	سازه	۱-۱-۱۲
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴.۰۳٪	معماری	۱-۱-۱۳
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱.۱۳٪	مطالعات مفهومی	۱-۲

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳


صفحه: ۵۳ از ۷۰

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

۳-۹-۱- جدول وضعیت مدارک مهندسی مطالعات پایه UTY :

وضعیت مدارک مهندسی UTY									
دیسپلین	کل مدارک	کل مدارک ارسال شده	وضعیت مدارک ارسال شده						مدارک باقی مانده
			App.with com.	App.	Com.	Reject	No Com.	Under Review	
PM	۲۵	۲۵	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
PR	۲۰۴	۲۰۴	۰	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
SA	۳۳	۳۳	۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
PI	۵۶	۵۶	۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
ME	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
MA	۲۲	۲۲	۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
HV	۲۰	۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
EL	۴۱	۴۱	۰	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
TL	۴	۴	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰
IN	۴۰	۴۰	۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
CV	۳۴	۳۴	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
ST	۱۶	۱۶	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
AR	۲۱	۲۱	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
Total	۵۲۶	۵۲۶	۰	۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۶									۰

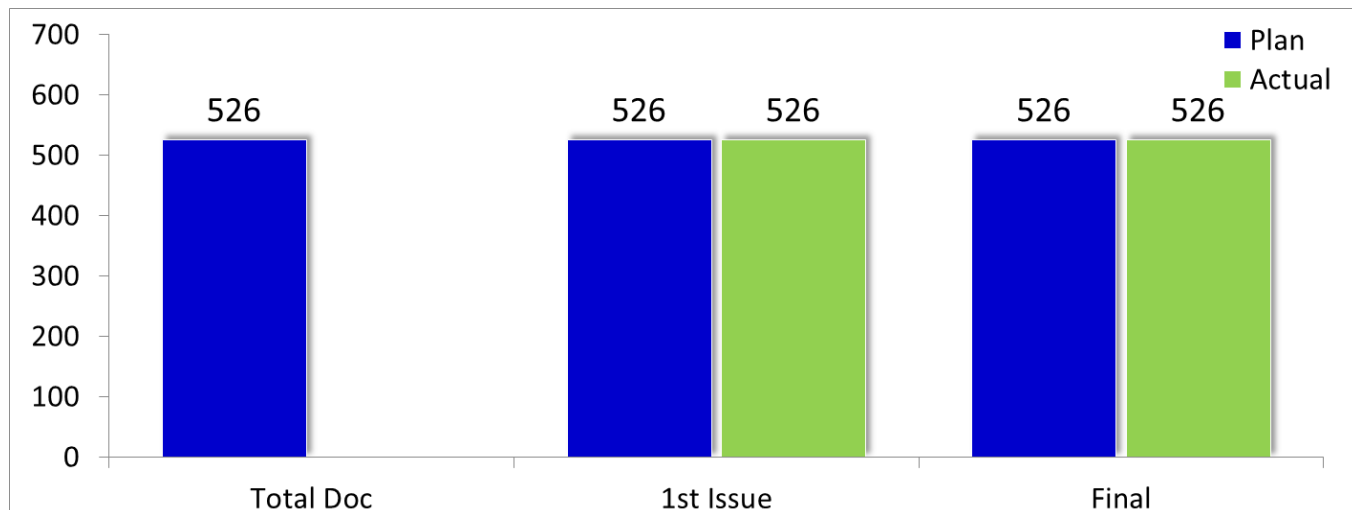

بخش پنجم:

وضعیت نیروی انسانی، ماشین آلات و HSE کل طرح

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۵۵ از ۷۰		

۴-۱- نیروی انسانی

گزارش آمار نیروی انسانی طرح در دوره گزارش بدین شرح می باشد:

ردیف	شرح	عنوان	تعداد	جمع
۱	کارفرما	کارکنان رسمی دفتر	۱	۴۴
		پیمانی دفتر	۶	
		پیمانی سایت	۳۷	
۲	مدیریت طرح	تهران	۴۷	۶۵
		سایت	۱۸	
۳	بازرس شخص ثالث	تهران	۲	۶
		سایت	۴	
۴	پیمانکار GTP	مدیریت، مهندسی و خرید دفتر	۱۴۲	۳۴۵
		سایت (اجرا) مستقیم	۷۸	
		سایت (اجرا) غیرمستقیم	۱۲۵	
۵	مشاور طراح پایه یوتیلیتی و آفسایت	مدیریت و مهندسی دفتر	۱	۱
۴۶۱	جمع کل			۴۶۱

تعداد نفرات دفتر تهران پیمانکار GTP، بر اساس گزارش مشارکت بینا و استیم درج گردیده است.

۴-۲- ماشین آلات

ردیف	نام دستگاه	تعداد
۱	backhoe-loader	۱
۲	Excavator	۱
۳	Loader	۲
۴	Compactor	۳
۵	Batching Plant	۱
۶	Concrete / Truck Mixer	۱
۷	Concrete Pump	۱
۸	Concrete Vibrator	۱
۹	Water Tank Lorry	۳
۱۰	Fuel Tank Lorry	۱
۱۱	Tractor	۱
۱۲	T-Trailer	۱
۱۳	Water Tanker	۵
۱۴	Fuel Tanker	۴
۱۵	Boom Truck	۱
۱۶	Crane 25 Ton TADANO	۲
۱۷	Crane 35 Ton TADANO	۱
۱۸	Crane 20 Ton	۱
۱۹	Lift Truck 10 Ton	۱
۲۰	Lift Truck 12 Ton	۲
۲۱	Power Generator	۷
۲۲	Air Compressor	۱
۲۳	Mini Loader	۱

۴-۳- وضعیت ایمنی طرح

تعداد نفرات ایمنی طرح در دوره گزارش به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	رکن پروژه / شرکت	تعداد نفرات HSE
۱	کارفرما	۱
۲	مدیریت طرح	۲
۳	پیمانکار GTP	۱۱
	جمع	۱۴

همچنین تعداد آنومالی های صادر شده و بسته شده در جدول زیر ارائه شده است:

گزارش ایمنی	
کل نفر ساعت کار شده	۳,۶۳۸,۷۸۹
تعداد حوادث منجر به فوت	۰
تعداد حوادث ناتوان کننده	۰
آنومالی های صادر شده	۱,۴۱۲
آنومالی های بسته شده	۱,۴۰۳
تعداد روز کاری از دست رفته	۰

بخش ششم:

صورت وضعیت های پیمانکاران طرح

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۵۹ از ۷۰		

۱-۵- جدول صورت وضعیت های پروژه GTP (پیمانکار بینا و استیم)

مشارکت بینا و استیم (پیمانکار GTP)									
شماره قرارداد ۱-۱/۱۷۶۶۸									
شماره صورت وضعیت	دوره صورت وضعیت		واحد پولی	ارسالی پیمانکار			تایید شده مدیر طرح		
	از تاریخ	تا تاریخ		مبلغ دوره	مبلغ تجمعی	تاریخ ارسال پیمانکار	مبلغ این دوره	مبلغ تجمعی	تاریخ تایید
۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	(ریال)	۱۱۷,۷۳۴,۵۵۳,۷۶۶	۱۱۷,۷۳۴,۵۵۳,۷۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۴,۴۱۵,۱۶۴,۸۵۶	۷۴,۴۱۵,۱۶۴,۸۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۴
			(یورو)	.	.		.	.	
۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	(ریال)	۱۶۱,۸۴۸,۸۹۲,۸۲۸	۲۵۴,۸۶۷,۸۴۸,۸۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۶۹,۹۷۱,۶۲۹,۰۹۵	۱۴۴,۳۸۶,۷۹۳,۹۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
			(یورو)	.	.		.	.	
۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	(ریال)	۸۳۸,۰۱۲,۵۲۲,۳۱۳	۱,۰۱۸,۴۹۶,۰۱۴,۷۵۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۶۳,۹۵۷,۵۹۲,۱۲۷	۳۰۸,۳۴۴,۳۸۶,۰۷۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
			(یورو)	۴,۵۳۳,۲۴۶	۴,۵۳۳,۲۴۶		.	.	
۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	(ریال)	۴۳۷,۰۹۶,۹۷۷,۶۷۲	۸۲۲,۵۲۷,۴۶۰,۲۷۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۶۷,۰۰۰,۳۷۹,۵۴۷	۳۷۵,۳۴۴,۷۶۵,۶۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
			(یورو)	۱,۹۲۳,۷۲۸	۱,۹۲۳,۷۲۸		۱,۸۳۰,۴۶۱	۱,۸۳۰,۴۶۱	
۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	(ریال)	۳۳۵,۷۳۱,۵۵۵,۴۶۳	۸۲۲,۵۲۷,۴۶۰,۲۷۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۱۰,۸۱۸,۳۹۰,۸۵۵	۵۸۶,۱۶۳,۱۵۶,۴۸۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
			(یورو)	.	۱,۹۲۳,۷۲۸		.	۱,۸۳۰,۴۶۱	
۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	(ریال)	۳۷۹,۵۳۰,۷۲۸,۹۲۹	۹۹۵,۴۴۴,۳۴۴,۷۸۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۲۳۷,۱۴۱,۶۱۴,۳۳۱	۸۲۳,۳۰۴,۷۷۰,۸۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
			(یورو)	۱,۷۲۸,۶۵۰	۳,۵۵۹,۱۱۱		۱,۶۱۸,۵۰۲	۳,۴۴۸,۹۶۳	
۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	(ریال)	۴۵,۴۷۰,۰۹۹,۲۶۳	۸۰۵,۵۲۹,۳۵۲,۸۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۴۵,۳۶۷,۲۱۲,۱۶۴	۸۶۸,۶۷۱,۹۸۲,۹۷۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
			(یورو)	۴۰۴,۳۱۱	۳,۸۵۳,۲۷۵		۳۴۸,۹۴۹	۳,۷۹۷,۹۱۲	
۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	(ریال)	۲۲۰,۴۶۷,۰۲۱,۵۱۱	۱,۱۶۴,۵۳۷,۵۴۲,۴۶۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۱۶,۱۲۴,۵۵۶,۳۷۷	۹۸۴,۷۹۶,۵۳۳,۳۵۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			(یورو)	۵۱۷,۱۰۱	۴,۳۱۵,۰۱۳		۴۵۵,۱۰۲	۴,۲۵۳,۰۱۴	
۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	(ریال)	۲۶۸,۲۹۲,۵۷۸,۱۴۴	۱,۱۸۹,۸۴۳,۶۰۰,۲۳۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۲۰۳,۷۶۱,۵۸۲,۹۴۸	۱,۱۸۸,۵۵۸,۱۲۲,۳۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
			(یورو)	.	۴,۳۱۵,۰۱۳		.	۴,۲۵۳,۰۱۴	
۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	(ریال)	۱۳۵,۷۸۹,۳۴۶,۹۴۸	۱,۴۰۳,۵۵۷,۷۷۴,۹۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۲۷,۷۳۳,۰۴۴,۶۵۷	۱,۳۱۶,۲۹۱,۱۶۶,۹۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
			(یورو)	۷۸,۰۸۷	۴,۳۳۱,۱۰۱		۷۸,۰۸۷	۴,۳۳۱,۱۰۱	
۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	(ریال)	۲۱۴,۷۸۶,۰۸۵,۵۴۱	۱,۶۴۷,۷۵۳,۰۷۸,۵۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۲۱۴,۷۸۶,۰۸۵,۵۴۱	۱,۵۳۱,۰۷۷,۲۵۲,۴۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
			(یورو)	.	۴,۳۳۱,۱۰۱		.	۴,۳۳۱,۱۰۱	
۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	(ریال)	۳۷۷,۰۶۷,۴۶۶,۸۹۱	۱,۸۴۴,۸۹۹,۲۰۲,۱۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۴۴,۱۷۴,۱۱۰,۲۴۶	۱,۷۷۵,۲۵۱,۳۶۲,۷۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
			(یورو)	.	۴,۳۳۱,۱۰۱		.	۴,۳۳۱,۱۰۱	
۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	(ریال)	۱۶۷,۶۱۴,۷۸۲,۵۲۹	۱,۷۴۸,۲۱۴,۳۵۸,۶۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۲۲,۷۵۶,۰۳۵,۴۷۱	۱,۸۹۸,۰۰۷,۳۹۸,۳۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
			(یورو)	۱۷۳,۸۷۱	۴,۵۰۴,۹۷۲		۱۴۹,۴۹۳	۴,۴۸۰,۵۹۴	
۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	(ریال)	۲۴۴,۴۵۷,۲۸۱,۶۲۵	۲,۰۰۷,۸۴۰,۴۹۸,۱۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۱۰,۰۴۲,۵۳۷,۵۸۳	۲,۱۰۸,۰۴۹,۹۳۵,۷۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
			(یورو)	.	۴,۴۸۰,۵۹۴		.	۴,۴۸۰,۵۹۴	
۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	(ریال)	۶۲۰,۱۷۹,۰۶۷,۳۵۷	۲,۸۰۷,۳۴۶,۸۹۸,۶۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴۵۲,۱۲۱,۵۳۸,۴۷۸	۲,۵۶۰,۱۷۱,۴۷۴,۲۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
			(یورو)	۲,۴۰۸,۳۲۷	۶,۸۸۸,۹۲۱		۱,۹۶۴,۶۳۳	۶,۴۴۵,۲۲۷	

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۶۰ از ۷۰		

مشارکت بینا و استیم (پیمانکار GTP)		شماره قرارداد		۱-۱/۱۷۶۶۸					
شماره صورتحساب وضعیت	دوره صورت وضعیت		واحد پولی	ارسالی پیمانکار		تایید شده مدیر طرح			
	از تاریخ	تا تاریخ		مبلغ دوره	مبلغ تجمعی	تاریخ ارسال پیمانکار	مبلغ این دوره	مبلغ تجمعی	تاریخ تأیید
۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	(ریال)	۲۹۹,۴۹۸,۵۸۰,۲۵۰	۲,۹۹۷,۴۱۱,۱۹۴,۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۴۶,۱۱۳,۱۸۰,۱۴۸	۲,۶۸۴,۹۲۰,۵۲۲,۰۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
			(یورو)	۰	۶,۴۴۵,۲۲۷		۰	۶,۴۴۵,۲۲۷	
۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	(ریال)	۲۹,۲۴۸,۳۶۸,۳۸۰	۲,۹۷۸,۹۸۲,۶۰۰,۷۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۹,۴۰۷,۵۵۲,۹۰۳	۲,۷۰۴,۳۲۸,۰۷۴,۹۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
			(یورو)	۷۵۵,۶۴۹	۷,۲۰۰,۸۷۶		۷,۱۷۷,۵۵۶	۷,۱۷۷,۵۵۶	
۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	(ریال)	۱۹۷,۰۱۰,۰۴۱,۳۴۵	۳,۱۷۰,۵۰۳,۱۷۲,۰۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۸۸,۱۴۲,۵۷۲,۴۱۵	۲,۸۹۲,۴۷۰,۶۴۷,۴۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
			(یورو)	۱,۵۰۳,۰۹۴	۸,۶۸۰,۶۵۰		۱,۲۷۸,۰۴۰	۸,۴۵۵,۵۹۶	
۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	(ریال)	۰	۲,۸۹۲,۴۷۰,۶۴۷,۴۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۰	۲,۸۹۲,۴۷۰,۶۴۷,۴۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
			(یورو)	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۵,۵۹۶		۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۵,۵۹۶	
۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	(ریال)	۵۳۰,۷۶۸,۳۴۶,۱۵۲	۳,۴۲۳,۲۳۸,۹۹۳,۵۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۵۲۵,۹۶۶,۹۵۰,۸۲۹	۳,۴۱۸,۴۳۷,۵۹۸,۲۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
			(یورو)	۱,۴۵۳,۷۶۳	۱۵,۱۵۹,۳۵۹		۱,۴۵۳,۷۶۳	۱۵,۱۵۹,۳۵۹	
۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	(ریال)	۱۱۲,۶۶۳,۲۸۳,۸۷۰	۱۱۲,۶۶۳,۲۸۳,۸۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۰۵,۵۲۵,۷۰۲,۸۳۶	۳,۴۸۰,۹۰۰,۰۱۷,۲۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
			(یورو)	۳,۵۹۵,۱۹۰	۱۸,۵۹۷,۹۶۷		۲۸۳,۷۲۶	۱۵,۲۸۶,۵۰۳	
۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	(ریال)	۰	۳,۴۹۴,۱۶۰,۰۶۶,۶۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۰	۳,۴۹۴,۱۶۰,۰۶۶,۶۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
			(یورو)	۴,۱۳۵,۲۰۲	۱۹,۴۲۱,۷۰۵		۵۲۸,۰۹۳	۱۵,۸۱۴,۵۹۷	
۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	(ریال)	۲۴۵,۴۵۷,۸۲۴,۶۵۹	۳,۷۳۹,۶۱۷,۸۹۱,۲۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۴۳,۶۸۲,۶۴۷,۷۵۲	۳,۷۳۷,۸۴۲,۱۸۴,۳۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
			(یورو)	۹۲۴,۶۱۳	۱۶,۴۴۸,۷۰۰		۶۱۵,۵۷۸	۱۶,۱۳۹,۶۶۵	
۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	(ریال)	۱۰۰,۶۵۴,۳۵۱,۲۸۸	۳,۸۳۸,۴۹۷,۰۶۵,۶۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۹۷,۰۷۱,۸۲۶,۴۷۴	۳,۸۳۴,۹۱۴,۵۴۰,۸۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
			(یورو)	۱,۰۴۱,۱۸۴	۱۷,۱۸۰,۸۵۰		۱,۰۴۱,۱۸۵	۱۷,۱۸۰,۸۵۰	
۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	(ریال)	۱۲,۹۸۴,۱۵۶,۸۰۶	۳,۸۴۷,۸۹۸,۶۹۷,۶۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۲,۰۳۶,۴۵۵,۹۰۵	۳,۸۴۶,۹۵۱,۰۰۶,۷۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
			(یورو)	۷,۲۸۶,۱۱۴	۲۴,۴۶۶,۹۶۳		۷,۰۸۵,۴۵۲	۲۴,۱۳۴,۰۹۲	
۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	(ریال)	۶۶,۴۹۵,۶۶۶,۸۸۹	۲,۵۶۲,۰۲۳,۷۸۴,۸۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۶۶,۴۹۵,۶۶۶,۸۸۹	۳,۹۱۳,۴۴۶,۶۷۳,۶۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
			(یورو)	۰	۲۴,۴۶۶,۹۶۳		۰	۲۴,۱۳۴,۰۹۲	
۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	(ریال)	۴,۷۱۳,۰۷۶,۰۶۶	۳,۸۵۰,۱۷۱,۹۶۳,۹۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۴,۳۲۸,۶۸۰,۲۱۰	۳,۹۱۷,۷۷۵,۳۵۳,۸۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵
			(یورو)	۷,۲۸۶,۱۱۴	۲۴,۴۶۶,۹۶۳		۳۲۸,۸۵۹	۲۴,۴۶۲,۹۵۱	
۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	(ریال)	۷۹,۸۱۰,۵۸۹,۲۵۷	۳,۹۹۷,۵۸۵,۹۴۳,۱۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۷۹,۶۹۸,۰۴۳,۵۳۱	۳,۹۹۷,۴۷۳,۳۹۷,۳۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹
			(یورو)	۶,۰۴۱,۵۷۶	۳۰,۵۰۴,۵۲۸		۵,۳۷۴,۸۷۱	۲۹,۸۲۷,۸۲۳	
۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(ریال)	۶۱,۱۰۵,۸۶۱,۱۹۶	۴,۰۴۵,۳۱۹,۲۰۹,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۷۸,۰۳۲,۷۵۹,۹۷۴	۴,۰۵۶,۳۷۰,۰۶۰,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۳
			(یورو)	۲,۷۰۴,۰۵۰	۳۲,۵۴۱,۸۷۳		۳,۰۰۶,۰۳۳	۳۲,۳۸۵,۷۹۰	
۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	(ریال)	۸۸,۹۵۳,۴۱۳,۴۱۱	۴,۱۳۲,۰۶۳,۴۲۴,۸۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۹,۷۷۲,۷۵۴,۰۵۶	۴,۱۶۶,۱۴۲,۸۱۴,۸۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
			(یورو)	۱,۷۰۳,۱۳۷	۳۴,۰۸۸,۹۲۶		۱,۷۰۳,۱۳۷	۳۴,۰۸۸,۹۲۶	

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۶۱ از ۷۰		

Shargan Consultant Engineers		لیست صورت وضعیتهای تایید شده EPC پروژه GTP							
شماره قرارداد		شماره ۱-۱/۱۷۶۶۸							
شماره صورت وضعیت	دوره صورت وضعیت		واحد پولی	ارسالی پیمانکار		تایید شده مدیر طرح			
	از تاریخ	تا تاریخ		مبلغ دوره	مبلغ تجمعی	تاریخ ارسال پیمانکار	مبلغ این دوره	مبلغ تجمعی	تاریخ تایید
۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	(ریال)	۲۲۲,۵۲۳,۶۸۰,۶۷۰	۴,۳۸۸,۶۶۶,۴۹۵,۵۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۰۱,۰۸۰,۰۸۹,۷۶۹	۴,۲۳۶,۹۴۱,۹۸۸,۹۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
			(یورو)	۱,۱۲۹,۰۷۷	۳۵,۲۱۹,۰۷۲		۱,۸۶۲,۰۳۷	۳۵,۱۴۶,۰۶۵	
۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(ریال)	۲۹,۵۱۵,۰۳۹,۷۷۷	۴,۲۷۸,۹۵۰,۵۱۸,۴۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳۲,۹۳۱,۶۲۲,۱۶۷	۴,۲۶۹,۸۷۳,۶۱۱,۰۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
			(یورو)	۱۰,۸۲۵,۵۵۴	۴۶,۰۴۳,۵۵۷		۸,۱۲۶,۰۰۶	۴۳,۲۷۲,۶۷۱	
۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	(ریال)	۶۰,۳۰۶,۶۴۶,۲۸۴	۴,۲۹۱,۵۹۷,۵۲۴,۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۲۸,۷۷۶,۵۸۰,۹۰۲	۴,۳۶۵,۰۵۷,۶۱۳,۵۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
			(یورو)	۰	۴۳,۲۷۲,۶۷۱		۰	۴۲,۵۵۵,۶۳۲	
۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	(ریال)	۱۳۱,۶۸۳,۲۰۳,۳۶۸	۴,۴۲۰,۵۹۵,۸۴۱,۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۱,۴۷۵,۷۷۸,۴۲۱	۴,۴۳۰,۳۸۸,۴۱۶,۶۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
			(یورو)	۴,۱۵۴,۶۱۰	۴۶,۷۱۰,۲۴۱		۱,۳۳۳,۱۷۷	۴۳,۸۸۸,۸۰۹	
۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(ریال)	۱۳۰,۰۷۷,۳۴۶,۴۲۵	۴,۵۶۷,۱۳۲,۱۸۱,۴۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۶,۶۳۱,۵۷۳,۲۱۴	۴,۴۹۱,۸۰۷,۹۹۸,۶۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۶
			(یورو)	۴۸,۸۰۶,۲۷	۴۸,۶۹۷,۴۳۶		۲,۲۰۹,۰۸۵	۴۵,۴۰۵,۷۱۹	
۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	(ریال)	۸۵,۸۴۰,۶۹۹,۵۰۵	۴,۵۹۲,۱۵۷,۰۵۹,۸۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۸۵,۸۳۹,۹۲۳,۲۳۴	۴,۵۷۷,۶۴۷,۹۲۱,۹۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
			(یورو)	۰	۴۸,۶۹۷,۴۳۶		۰	۴۵,۴۰۵,۷۱۹	
۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	(ریال)	۱۱,۶۲۵,۵۴۷,۵۶۱	۴,۵۹۰,۱۳۷,۲۳۱,۳۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۳,۶۸۵,۷۳۳,۳۷۲	۴,۷۲۱,۱۸۲,۶۲۲,۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
			(یورو)	۷,۱۰۹,۲۵۳	۵۲,۵۱۴,۹۷۳		۱,۱۸۷,۲۶۵	۴۶,۵۹۲,۹۸۴	
۳۷	رسیدگی مجدد		(ریال)	GTP-L-BST-SHT-۴	مستندات تکمیلی مربوط به کمپرسور (COMPRESSOR C) جهت (I/II, C-۳۰۰۲۳۰۰۱)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۳,۶۸۵,۷۳۳,۳۷۲	۴,۷۲۱,۱۸۲,۶۲۲,۴۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱
			(یورو)					۴,۰۷۰,۸۶۵	
۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(ریال)	۵۲,۲۲۱,۵۴۵,۴۶۱	۴,۷۷۳,۴۰۴,۱۶۷,۸۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۰۹,۴۸۱,۵۱۰,۷۹۰	۴,۷۶۷,۹۳۶,۵۲۶,۱۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
			(یورو)	۷,۸۶۸,۵۹۷	۵۷,۳۴۵,۱۸۰		۶,۹۴۸,۷۵۹	۵۶,۴۲۴,۹۳۳	
۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	(ریال)	۲۹,۵۳۸,۷۹۵,۴۳۶	۴,۷۹۷,۸۸۵,۶۲۶,۴۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۵۶,۶۷۶,۷۷۸,۱۰۰	۴,۸۲۱,۰۶۷,۲۱۴,۳۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
			(یورو)	۴,۹۹۶,۱۷۷	۶۱,۶۴۱,۵۳۲		۲,۴۴۹,۱۹۳	۵۸,۵۴۱,۳۰۳	
۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	(ریال)	۹۰,۹۵۸,۱۴۰,۸۷۹	۴,۸۸۸,۸۴۳,۷۶۷,۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶۸,۱۹۳,۳۶۴,۱۲۰	۴,۸۹۱,۹۳۷,۴۸۷,۸۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷
			(یورو)	۲,۵۴۲,۳۹۷	۶۳,۵۹۹,۰۱۲		۲,۷۳۶,۴۵۸	۶۱,۲۵۶,۸۹۹	
۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(ریال)	۱۴۹,۳۸۷,۶۰۳,۵۷۵	۵,۰۲۳,۸۳۸,۴۳۵,۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳۹,۹۶۰,۵۰۹,۳۰۵	۴,۹۲۳,۸۷۹,۱۷۹,۷۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹
			(یورو)	۵,۱۹۵,۵۳۲	۶۶,۴۵۲,۴۳۰		۴,۳۶۷,۷۵۷	۶۴,۸۹۰,۷۴۲	

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۶۲ از ۷۰		

جدول پیش پرداخت های پروژه GTP (پیمانکار بینا و استیم)

خلاصه وضعیت پیش پرداخت های پروژه GTP										
مشارکت بینا و استیم										
خلاصه وضعیت پیش پرداختهای بخش مهندسی (E)										
مبلغ بخش مهندسی (E) در قرارداد:			مبلغ پیش پرداخت (۲۵ درصد):			مبلغ بخش مهندسی (E) در قرارداد: ۱,۹۲۴,۰۸۷,۷۷,۰۰۰				
ردیف	عنوان	تاریخ ادعا	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص	تایید مدیریت طرح
درخواستی پیمانکار			مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص	تایید کارفرما
مبلغ بخش مهندسی (E) در قرارداد:			مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص	تایید کارفرما
ردیف	عنوان	تاریخ ادعا	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص	تایید کارفرما
ردیف	عنوان	تاریخ ادعا	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص	تایید کارفرما
۱	پیش پرداخت مهندسی (ریال)		۴۸۱,۰۲۱,۹۲۲,۵۰۰	۴۸۱,۰۲۱,۹۲۲,۵۰۰		۴۸۱,۰۲۱,۹۲۲,۵۰۰	۴۸۱,۰۲۱,۹۲۲,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۴۸۱,۰۲۱,۹۲۲,۵۰۰	۲۵٪
پس از ابلاغ شروع به کار										
خلاصه وضعیت پیش پرداختهای بخش خرید (P)										
مبلغ بخش خرید (P) قرارداد (یورو):			مبلغ پیش پرداخت (۲۵ درصد):			مبلغ بخش خرید (P) قرارداد (یورو): ۲۱۰,۲۶۴,۵۹۴				
ردیف	واحد پولی	عنوان	تاریخ ادعا	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص
درخواستی پیمانکار			مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص	تایید کارفرما
مبلغ بخش خرید (P) قرارداد (یورو):			مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص	تایید کارفرما
ردیف	واحد پولی	عنوان	تاریخ ادعا	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص
ردیف	واحد پولی	عنوان	تاریخ ادعا	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص
۱	یورو	پیش پرداخت ۱ خرید	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۱,۷۳۴,۲۸۹	۱۱,۷۳۴,۲۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۱,۷۳۴,۲۸۹	۱۱,۷۳۴,۲۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۹۱,۴۷۶,۳۲۱
۲	یورو	پیش پرداخت ۲ خرید	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۳۲,۹۷۰,۵۲۶	۳۲,۹۷۰,۵۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۳۲,۹۷۰,۵۲۶	۳۲,۹۷۰,۵۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۲۹,۸۶۱,۵۱۴
۳	یورو	پیش پرداخت ۳ خرید	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۳۲,۵۱۴,۱۵۶	۳۲,۵۱۴,۱۵۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۳۲,۵۱۴,۱۵۶	۳۲,۵۱۴,۱۵۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۳۲,۱۷۱,۵۷۱
۴	یورو	پیش پرداخت ۴ خرید	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۲۴,۷۲۱,۵۷۱	۲۴,۷۲۱,۵۷۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۲۴,۷۲۱,۵۷۱	۲۴,۷۲۱,۵۷۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۲۴,۷۲۱,۵۷۱
۵	یورو	پیش پرداخت ۵ خرید	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۴,۳۵۰,۶۴۳	۳۴,۳۵۰,۶۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۴,۳۵۰,۶۴۳	۳۴,۳۵۰,۶۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۴,۳۵۰,۶۴۳
۶	یورو	پیش پرداخت ۶ خرید	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۴,۸۱۹,۷۰۹	۳۴,۸۱۹,۷۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۴,۸۱۹,۷۰۹	۳۴,۸۱۹,۷۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۴,۸۱۹,۷۰۹
۷	یورو	پیش پرداخت ۷ خرید	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۵,۷۸۰,۹۰۸	۳۵,۷۸۰,۹۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۵,۷۸۰,۹۰۸	۳۵,۷۸۰,۹۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۵,۷۸۰,۹۰۸
۸	یورو	پیش پرداخت ۸ خرید	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۶,۳۴۰,۰۶۲	۳۶,۳۴۰,۰۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۶,۳۴۰,۰۶۲	۳۶,۳۴۰,۰۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۶,۳۴۰,۰۶۲
۹	یورو	پیش پرداخت ۹ خرید	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۷,۳۶۶,۲۰۴	۳۷,۳۶۶,۲۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۷,۳۶۶,۲۰۴	۳۷,۳۶۶,۲۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۷,۳۶۶,۲۰۴
۱۰	یورو	پیش پرداخت ۱۰ خرید	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۸,۲۴۵,۸۷۱	۳۸,۲۴۵,۸۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۸,۲۴۵,۸۷۱	۳۸,۲۴۵,۸۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۸,۲۴۵,۸۷۱
۱۱	یورو	پیش پرداخت ۱۱ خرید	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳۵,۸۱۱,۷۳۱	۳۵,۸۱۱,۷۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۳۵,۸۱۱,۷۳۱	۳۵,۸۱۱,۷۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۳۵,۸۱۱,۷۳۱
۱۲	یورو	پیش پرداخت ۱۲ خرید	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۳۸,۵۵۹,۶۹۰	۳۸,۵۵۹,۶۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۳۸,۵۵۹,۶۹۰	۳۸,۵۵۹,۶۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۳۸,۵۵۹,۶۹۰
۱۳	یورو	پیش پرداخت ۱۳ خرید	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۴۲,۱۰۶,۱۸۱	۴۲,۱۰۶,۱۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۴۲,۱۰۶,۱۸۱	۴۲,۱۰۶,۱۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۴۲,۱۰۶,۱۸۱
۱۴	یورو	پیش پرداخت ۱۴ خرید	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۴۲,۹۰۲,۰۴۴	۴۲,۹۰۲,۰۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۴۲,۹۰۲,۰۴۴	۴۲,۹۰۲,۰۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۴۲,۹۰۲,۰۴۴
۱۵	یورو	پیش پرداخت ۱۵ خرید	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۴۳,۰۵۸,۵۳۴	۴۳,۰۵۸,۵۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۴۳,۰۵۸,۵۳۴	۴۳,۰۵۸,۵۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۴۳,۰۵۸,۵۳۴
۱۶	یورو	پیش پرداخت ۱۶ خرید	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴۳,۱۵۹,۳۸۱	۴۳,۱۵۹,۳۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۴۳,۱۵۹,۳۸۱	۴۳,۱۵۹,۳۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۴۳,۱۵۹,۳۸۱
۱۷	یورو	پیش پرداخت ۱۷ خرید	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۴۴,۱۲۵,۰۱۱	۴۴,۱۲۵,۰۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۴۴,۱۲۵,۰۱۱	۴۴,۱۲۵,۰۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۴۴,۱۲۵,۰۱۱
۱۸	یورو	پیش پرداخت ۱۸ خرید	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۴۴,۲۶۸,۶۵۴	۴۴,۲۶۸,۶۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۴۴,۲۶۸,۶۵۴	۴۴,۲۶۸,۶۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۴۴,۲۶۸,۶۵۴
۱۹	یورو	پیش پرداخت ۱۹ خرید	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۴۴,۲۹۹,۲۲۱	۴۴,۲۹۹,۲۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۴۴,۲۹۹,۲۲۱	۴۴,۲۹۹,۲۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۴۴,۲۹۹,۲۲۱
۲۰	یورو	پیش پرداخت ۲۰ خرید	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۴۵,۱۸۳,۲۱۸	۴۵,۱۸۳,۲۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۴۵,۱۸۳,۲۱۸	۴۵,۱۸۳,۲۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۴۵,۱۸۳,۲۱۸
۲۱	یورو	پیش پرداخت ۲۱ خرید	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۴۵,۲۳۲,۵۰۵	۴۵,۲۳۲,۵۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۴۵,۲۳۲,۵۰۵	۴۵,۲۳۲,۵۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۴۵,۲۳۲,۵۰۵
۲۲	یورو	پیش پرداخت ۲۲ خرید	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۴۵,۳۹۶,۶۱۸	۴۵,۳۹۶,۶۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۴۵,۳۹۶,۶۱۸	۴۵,۳۹۶,۶۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۴۵,۳۹۶,۶۱۸
۲۳	یورو	پیش پرداخت ۲۳ خرید	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴۵,۵۰۳,۰۹۹	۴۵,۵۰۳,۰۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴۵,۵۰۳,۰۹۹	۴۵,۵۰۳,۰۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴۵,۵۰۳,۰۹۹
۲۴	یورو	پیش پرداخت ۲۴ خرید	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴۶,۸۲۴,۶۸۸	۴۶,۸۲۴,۶۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۴۶,۸۲۴,۶۸۸	۴۶,۸۲۴,۶۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۴۶,۸۲۴,۶۸۸
۲۵	یورو	پیش پرداخت ۲۵ خرید	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۴۶,۸۷۸,۸۷۶	۴۶,۸۷۸,۸۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۴۶,۸۷۸,۸۷۶	۴۶,۸۷۸,۸۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۴۶,۸۷۸,۸۷۶
۲۶	یورو	پیش پرداخت ۲۶ خرید	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۴۶,۸۹۸,۹۹۱	۴۶,۸۹۸,۹۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۴۶,۸۹۸,۹۹۱	۴۶,۸۹۸,۹۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۴۶,۸۹۸,۹۹۱
۲۷	یورو	پیش پرداخت ۲۷ خرید	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۴۶,۸۹۸,۹۹۱	۴۶,۸۹۸,۹۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۴۶,۸۹۸,۹۹۱	۴۶,۸۹۸,۹۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۴۶,۸۹۸,۹۹۱
پایپ، فلنج، فیتینگ										
خلاصه وضعیت پیش پرداختهای اجرا (C)										
مبلغ بخش اجرا (C) در قرارداد:			مبلغ پیش پرداخت (۲۵ درصد):			مبلغ بخش اجرا (C) در قرارداد: ۱۵,۸۵۴,۴۸۲,۲۴۴,۸۰۰				
ردیف	عنوان	تاریخ ادعا	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص	تایید مدیریت طرح
درخواستی پیمانکار			مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص	تایید کارفرما
مبلغ بخش اجرا (C) در قرارداد:			مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص	تایید کارفرما
ردیف	عنوان	تاریخ ادعا	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص	تایید کارفرما
ردیف	عنوان	تاریخ ادعا	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ رسیدگی	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ دوره ای ناخالص	تاریخ پرداخت	مبلغ دوره ای ناخالص	تایید کارفرما
۱	پیش پرداخت اجرا قسط اول (ریال)		۹۵۱,۲۶۸,۹۹۳,۴۸۸	۹۵۱,۲۶۸,۹۹۳,۴۸۸		۹۵۱,۲۶۸,۹۹۳,۴۸۸	۹۵۱,۲۶۸,۹۹۳,۴۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۹۵۱,۲۶۸,۹۹۳,۴۸۸	۶۰۰٪
۲	پیش پرداخت اجرا قسط دوم (ریال)		۱,۶۶۴,۷۲۰,۷۳۸,۶۰۴	۱,۶۶۴,۷۲۰,۷۳۸,۶۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱,۶۶۴,۷۲۰,۷۳۸,۶۰۴	۱,۶۶۴,۷۲۰,۷۳۸,۶۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱,۶۶۴,۷۲۰,۷۳۸,۶۰۴	۱۰۰٪
پس از تکمیل بخش ثابت تجهیز کارگاه ورود ماشین آلات و تجهیزات و ارائه بیمه نامه ها										
کل پیش پرداختها										
مبلغ قرارداد (بخش ریالی):			مبلغ پیش پرداخت قرارداد:			مبلغ قرارداد (بخش ریالی): ۱۸,۰۷۴,۴۹۵,۶۹۳,۸۲۶				
مبلغ قرارداد (بخش یورویی):			مبلغ پیش پرداخت قرارداد:			مبلغ قرارداد (بخش یورویی): ۲۱۰,۲۶۴,۵۹۴				
ردیف	عنوان	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ تجمعی ناخالص	درصد از کل پیش پرداخت (تجمعی)	تاریخ پرداخت (تجمعی)	مبلغ تجمعی ناخالص	مبلغ تجمعی ناخالص	درصد از کل پیش پرداخت (تجمعی)	تاریخ پرداخت (تجمعی)	توضیحات
۱	بخش ریالی	۲,۱۴۵,۷۴۲,۶۸۱,۱۰۴	۲,۱۴۵,۷۴۲,۶۸۱,۱۰۴	۱۱.۸۷٪	۲,۱۴۵,۷۴۲,۶۸۱,۱۰۴	۲,۱۴۵,۷۴۲,۶۸۱,۱۰۴	۲,۱۴۵,۷۴۲,۶۸۱,۱۰۴	۱۱.۸۷٪	۲,۱۴۵,۷۴۲,۶۸۱,۱۰۴	-
۲	بخش یورویی	۶۵,۹۷۸,۶۵۲,۰۵۴	۶۵,۹۷۸,۶۵۲,۰۵۴	۲۲.۲۹٪	۶۵,۹۷۸,۶۵۲,۰۵۴	۶۵,۹۷۸,۶۵۲,۰۵۴	۶۵,۹۷۸,۶۵۲,۰۵۴	۲۲.۲۹٪	۶۵,۹۷۸,۶۵۲,۰۵۴	-

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳	گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه	شماره پروژه: GTPP 1-1/24131
صفحه: ۶۳ از ۷۰		

۲-۱-۵- جدول صورت وضعیت های هیربدان

		لیست صورت وضعیتهای تایید شده																						
						شماره قرارداد		شرکت مدیریت هیربدان																
تایید/پرداخت کارفرما (بدون احتساب ارزش افزوده)						تایید شده مدیر طرح				ارسالی پیمانکار		واحد بولی	دوره صورت وضعیت		شماره صورت وضعیت									
تاریخ		مبلغ ناخالص تجمعی		مبلغ ناخالص دوره		تاریخ تایید		مبلغ تجمعی		مبلغ این دوره			تاریخ ارسال پیمانکار			مبلغ تجمعی		مبلغ دوره		از تاریخ		تا تاریخ		
۱۴۰۲/۰۴/۰۵		۳۱,۴۱۳,۶۹۰		۳۱,۴۱۳,۶۹۰		۱۴۰۲/۰۳/۲۱		۴۴,۸۷۶,۷۰۰,۰۰۰		۴۴,۸۷۶,۷۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۳/۱۰		۴۴,۸۷۶,۷۰۰,۰۰۰		۴۴,۸۷۶,۷۰۰,۰۰۰		(ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۰۹		۱۴۰۲/۰۱/۱۴		۱
		۸۹,۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰		۵۸,۳۳۹,۷۱۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۵/۱۸		۸۹,۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰		۵۸,۳۳۹,۷۱۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۵/۰۹		۸۹,۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰		۵۸,۳۳۹,۷۱۰,۰۰۰		(ریال)		۱۴۰۲/۰۴/۰۸		۱۴۰۲/۰۳/۰۹		۲
۱۴۰۲/۰۹/۱۹		۱۳۲,۴۹۱,۷۰۰,۰۰۰		۴۲,۷۳۸,۳۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۸/۰۲		۱۳۴,۶۳۰,۱۰۰,۰۰۰		۴۴,۸۷۶,۷۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۷/۲۴		۱۳۴,۶۳۰,۱۰۰,۰۰۰		۴۴,۸۷۶,۷۰۰,۰۰۰		(ریال)		۱۴۰۲/۰۷/۲۳		۱۴۰۲/۰۵/۰۹		۳

گزارش تصویری طرح

منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۶۵ از ۷۰


گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131


اجرای فعالیت های لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان آزمایشگاه



عملیات نصب جوشکاری TK-7001 C

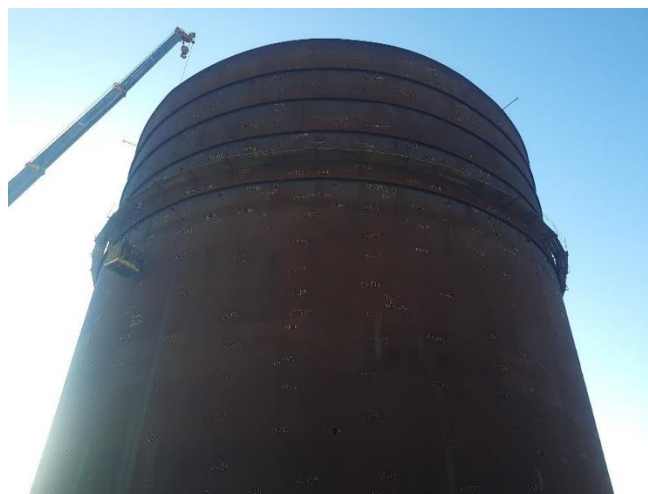

اجرای فعالیت های الکتریکال ساختمان DCC

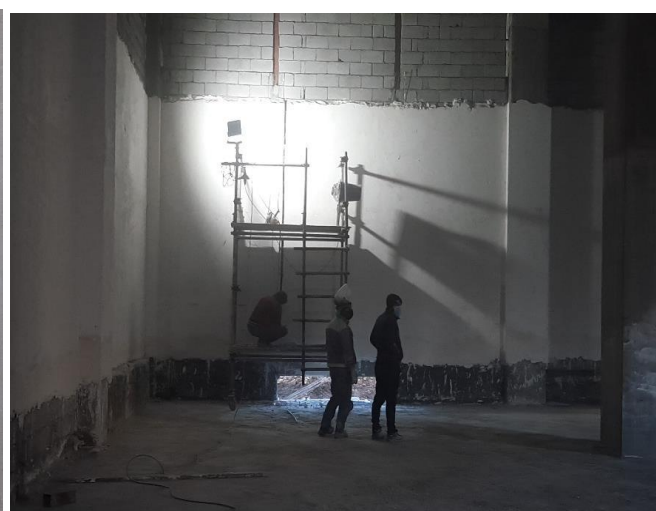

عملیات حفاری و بتن ریزی شمع T-5002



اجرای قالب بندی و آرماتوربندی V.Pit



عملیات داربست بندی و نصب متعلقات Gas Stack



منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۶۷ از ۷۰

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

اجرای فعالیت های سیویل PR-001



اجرای فعالیت های سیویل PR-002



اجرای فعالیت های سیویل PR-003



منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۶۸ از ۷۰


گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

اجرای نصب اسکلت فلزی BR-002



ورود APH ریفرمر به سایت

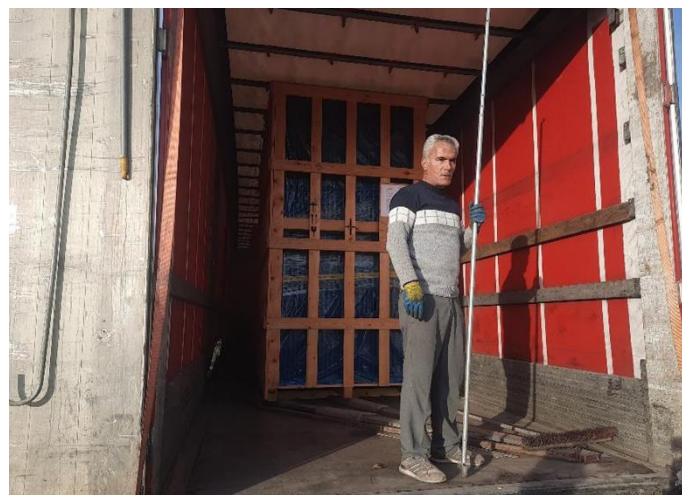

اجرای سیویل فونداسیون Reformer



منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۶۹ از ۷۰

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

عملیات آرماتوربندی فونداسیون PR-005 PVM



اجرای سیویل PR-1001



عملیات اجرایی خطوط زیرزمینی HDPE



منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۳

صفحه: ۷۰ از ۷۰

گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه

شماره پروژه: GTPP 1-1/24131

عملیات بکفیل خطوط زیرزمینی واحد Tankage



عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی شمع T-5002

